

Concept investeringsagenda 2018-2021

Groenalliantie Midden-Holland E.O.



30 oktober 2018



Inhoud

Inleiding	5
Gebiedsoverschrijdende projecten	11
Krimpenerhout	15
Loetbos	23
Reeuwijkse Hout	29
Goudse Hout	35
Gouwebos	43
Twaalfmorgen	49
't Weegje / Oostpolder	53
Elfhoeven	59
Bijlage 1: Projecten in uitvoering	65



Inleiding

Het bestuur van de Groenalliantie voert een kwaliteitsimpuls uit voor haar natuur- en recreatiegebieden. Het bestuur beoogt met een meerjarig investeringsprogramma de natuur- en recreatiewaarden van de gebieden te verhogen en onderling en met hun omgeving te verbinden. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het 'Programma kwaliteitsimpuls Groenalliantie' en heeft als kerndoelen:

- Verhogen van de belevingswaarde van de gebieden
- Verhogen van de gebruikswaarde van de gebieden
- Verhogen van de toekomstwaarde van de gebieden

Het Programma kwaliteitsimpuls Groenalliantie komt voort uit meerdere kwaliteitsimpulsen die de Groenalliantie heeft uitgevoerd vanaf 2013. In 2016 is besloten om de kwaliteitsimpulsen samen te brengen in één programma. Het programma heeft een beoogde looptijd van vijf jaar (2016 – 2021). Het programma kent drie typen investeringen:

1. Versterken structuren
2. Toevoegen (recreatieve) voorzieningen
3. Realiseren verbindingen

Uitvoeringsplannen

De Groenalliantie heeft ten behoeve van de kwaliteitsimpuls en beoogde investeringen twee Uitvoeringsplannen ontwikkeld: Uitvoeringsplan Krimpenerwaard (bestuurlijk vastgesteld in 2015) en Uitvoeringsplan Reeuwijkse Plassen (bestuurlijk vastgesteld in 2016). De Uitvoeringsplannen bevatten ontwikkelingsperspectieven voor alle beheergebieden van de Groenalliantie. Deze perspectieven voorzien in een beoogde basisstructuur en gewenste (recreatieve) voorzieningen. Hier hebben zoveel mogelijk projecten en ideeën die in interactie met gebiedspartners naar voren zijn gekomen een plek gekregen in een samenhangend geheel. De ontwikkelingsperspectieven bieden een inhoudelijk kader dat de Groenalliantie hanteert voor toetsing van wenselijkheid en haalbaarheid van nieuwe initiatieven van derden en verdere eigen ontwikkeling in de gebieden.

Investeringsagenda's

Beide Uitvoeringsplannen gaan vergezeld van een investeringsagenda. Deze investeringsagenda's bevatten overzichten van uitvoeringsprojecten die gebaseerd zijn op de door gebiedspartners aangedragen projecten en ideeën. Met de projecten geeft de Groenalliantie invulling aan de beoogde kwaliteitsimpuls binnen de vigerende kaders van de Uitvoeringsplannen. De investeringsagenda's zijn dynamische agenda's die in de tijd aangescherpt kunnen worden op basis van de voortgang van het programma of als de maatschappelijke dynamiek of bestuurlijke realiteit daarom vragen.

Herijking investeringsagenda's

In de zomer van 2018 zijn de investeringsagenda's herijkt. Deze herijking is wenselijk omdat:

- De voortgang van het programma vraagt om actualisatie van de projecten op de investeringsagenda's
 - 35 projecten zijn in uitvoering (aanbesteding / in uitvoering / uitgevoerd)
 - 17 projecten zijn nog niet opgepakt
 - 7 nieuwe projecten zijn geagendeerd
- De maatschappelijke dynamiek vraagt om actualisatie van de benodigde investeringen
 - Door veranderende marktomstandigheden liggen de aanbestedingsprijzen circa 15 procent hoger ten opzichte van 2015
- De bestuurlijke realiteit vraagt om een herijking van de agenda
 - Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is er een vrijwel geheel nieuw bestuur aangetreden bij de Groenalliantie

Bij de herijking van de investeringsagenda's is er voor gekozen om de agenda's van de Krimpenerwaard en de Reeuwijkse Plassen samen te voegen tot één investeringsagenda Groenalliantie (2018-2021). Hierbij is aangegeven welke projecten al zijn opgestart en zijn alle overige en nieuwe projecten opgenomen op de agenda. Tevens zijn alle investeringsbehoeften geactualiseerd. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van alle projecten die in uitvoering zijn genomen.

Uitvoeringskosten

Alle projecten zijn voorzien van een indicatie van de uitvoeringskosten. In deze fase van agendering zijn de indicaties gebaseerd op basis van globale projectomschrijvingen. De bandbreedte van de uitvoeringskosten is vijftig procent.

Wanneer projectideeën zijn uitgewerkt naar Voorlopige Ontwerpen wordt er een nauwkeurige raming gemaakt van de uitvoeringskosten. Hiervoor wordt de zogenaamde 'Standardsystematiek voor Kostenramingen' (SSK) gehanteerd. Dit is een systematiek voor het maken van kostenramingen in de bouw en biedt een handreiking voor kostenmanagement. De SSK is ontwikkeld door het CROW (een non-profit kennispartner voor overheden, aannemers en adviesbureaus).

Onder de uitvoeringskosten worden de volgende kostenposten geschaard: directe bouwkosten, algemene kosten / winst & Risico, overige kosten (zoals legeskosten en bouwplaatskosten), post onvoorzien, projectmanagement, omgevingsmanagement en kosten voor voorbereiding en toezicht.

Planvormingskosten

De planvormingskosten maken een substantieel onderdeel uit van de totale projectkosten. Om de proceskosten te bepalen wordt gebruik gemaakt van een normpercentage. De grondslag voor dit normpercentage is een percentage van de geraamde uitvoeringskosten. Hierbij worden voor projecten onder de € 100.000 een standaard percentage van 40% gehanteerd, bij projecten boven de € 100.000 een standaard percentage van 30% en bij projecten boven de € 200.000 een standaard percentage van 20%. Bij specifieke projecten zoals het realiseren van een uitkijktoren of grootschalige aanpassing van bosstructuren worden afwijkende (lagere) percentages gehanteerd.

De planvorming voorziet in:

- het maken van een ontwerp in samenwerking met gebiedspartners en in interactie met belanghebbenden (iteratief proces)
- omgevingsmanagement en communicatie
- het ramen van de uitvoeringskosten (SSK-raming) en meerjarige beheerkosten
- het organiseren van financiering (uitvoeringmiddelen, beheermiddelen en subsidies)
- opstellen vergunningendossier
- risicomanagement (risico's en beheermaatregelen)
- veldonderzoeken zoals flora&fauna, Klic melding, archeologische toets en bodemonderzoek
- Afspraken met samenwerkingspartijen en overige partijen (samenwerkingsovereenkomsten, beheerovereenkomsten)

Beheerkosten

Nieuwe investeringen leiden veelal tot hogere (toekomstige) beheerkosten. Om de meerjarige beheerkosten indicatief te duiden wordt gebruik gemaakt van een normpercentage. De grondslag voor dit normpercentage is een percentage van geschatte uitvoeringskosten. De gehanteerde percentages zijn gebaseerd op ervaringscijfers (mede van de kwaliteitsimpuls Groenalliantie). Voor investeringen in recreatieve voorzieningen wordt een standaard percentage van 8% gehanteerd. Voor projecten gericht op herinrichting van gebieden (bijvoorbeeld entrees) en herstructurering van paden wordt een standaard percentage van 5% gehanteerd. Bij projecten gericht op aanpassing van landschappelijke structuren (zoals bosstructuren en oevers) worden geen extra beheerkosten geraamd (percentage 0%).

De verandering in beheerkosten zoals aangegeven in de investeringsagenda zijn indicatief maar wel richtinggevend voor de planvorming. In de planvormingsfase worden de ontwerpen voorzien van een meerjarige beheerkostenraming (op basis van het Terrein Beheer Model) en bij realisatie worden de daadwerkelijke beheerkosten opgenomen in de beheerbegroting.

Uitgangspunten voor de investeringsbeslissing

De investeringsagenda Groenalliantie (2018-2021) biedt de basis voor de Groenalliantie voor verdere versterking van haar beheergebieden. Het bestuur van de Groenalliantie besluit welke projecten zij opstart en stelt daarvoor middelen beschikbaar. Wanneer het

bestuur opdracht geeft tot het opstarten van projecten, worden de projecten uitgewerkt tot concrete projectplannen (SMART). De projectplannen moeten voldoen aan de volgende uitgangspunten:

Uitgangspunt 1

Projecten moeten recreatieve meerwaarde bieden en bijdragen aan de versterking van de identiteit en de structuur van het gebied

Uitgangspunt 2

Projecten moeten passen binnen de zoneringskaarten en ontwikkelingsrichtingen van desbetreffend beheergebied zoals opgenomen in het Uitvoeringsplan Krimpenerwaard (2015) of Reeuwijkse Plassen (2016). Indien afgeweken wordt van de zoneringskaarten en/of ontwikkelingsrichting dient dit gemotiveerd te worden en worden voorgelegd ter instemming van het bestuur van de Groenalliantie.

Uitgangspunt 3

Projecten moeten voorzien zijn van een procesvoorstel dat voorziet in afstemming met gebiedspartners (bestuurlijk en maatschappelijk)

Uitgangspunt 4

Projecten moeten aansluiten bij (bestaande) doelgroepen en recreatiemotieven

Uitgangspunt 5

Projecten moeten voorzien zijn van een investeringsraming en een meerjarige beheerkostenraming



OVERZICHT INVESTERINGSAGENDA GROENALLIANTIE (2018-2021)

Gebied	Versterken structuren	Toevoegen voorzieningen	Realiseren verbindingen
Gebieds-overschrijdend			Verkennen prioritaire verbindingen
Krimpenerhout		Aanleg bootcampparcours	
		Aanleg paaltjesroute	
		Aanleg van drie speelplaatsen	
Loetbos		Realisatie uitkijktoren	
		Verkenning doorontwikkeling Hendrikshoeve	
Reeuwijkse Hout	Herinrichting strand- en oeverzone		
	Aanpassing bosstructuren		
Goudse Hout	Herinrichten padenstructuur	Opstellen ontwikkelingskader stadstuin Goudse Hout	
	Aanpassing bosstructuren en graslandbeheer		
	Herinrichting entree Platteweg		
	Herinrichting entree Achterwillensebocht		
Gouwebos		Opwaarderen speelvoorziening Boskoopzijde	
Twaalfmorgen			
't Weegje / Oostpolder	Verkenning herinrichting spoorzone	Aanleg wandel- en fietsverbinding ten oosten van Wilhelminakade	
Elfhoeven	Herinrichting entree		

Overzicht investeringsagenda

De investeringsagenda bestaat uit een overzicht van uitvoeringsprojecten die gebaseerd zijn op de door gebiedspartners aangedragen projecten en ideeën. In onderstaande tabel is een totaaloverzicht opgenomen waarbij per beheergebied de projecten zijn weergegeven. Hierbij is aangegeven of de project (primair) bijdragen aan 1) het versterken van structuren 2) het toevoegen van voorzieningen of 3) het realiseren van verbindingen.

In het navolgende worden alle projecten per beheergebied kort toegelicht inclusief een indicatie van de kosten voor uitvoering, planvorming en beheer.



Gebiedsoverschrijdende projecten

Projecten in uitvoering

In 2016-2018 zijn twee gebiedsoverschrijdende projecten opgepakt:

- Het project 'Communicatie- en informatievoorziening' heeft geleid tot een staalkaart voor bebording en bewegwijzering van de gebieden. Per gebied is een bebordingsplan gemaakt. Uitvoering van alle bebordingsplannen is voorzien in 2019/2020.
- Het 'Hondenbeleid Groenalliantie' is in ontwikkeling. Hiertoe wordt een schapsverordening opgesteld, een vergunningensysteem voor hondenuitlaatservices en een zonering in de beheergebieden. Het in werking treden van het hondenbeleid voor alle beheergebieden van de Groenalliantie is voorzien in 2019.
- In bijlage 1/gebiedsoverschrijdende projecten is een impressie opgenomen van de staalkaart voor bebording en bewegwijzering.


Geagendeerde projecten

Er is lopende het proces van de kwaliteitsimpuls één nieuw gebiedsoverschrijdend project geagendeerd: het verkennen van prioritaire recreatieve verbindingen (zie onderstaande tabel). Dit nieuw geagendeerde project is in het navolgende kort toegelicht.

GEBIEDSOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN		
In uitvoering	Reeds geagendeerd	Nieuw geagendeerd
Communicatie en informatievoorziening		Verkennen prioritaire verbindingen
Gevarieerd bos- en graslandbeheer		
Hondenbeleid Groenalliantie		

PROJECT GO4**VERKENNEN PRIORITAIRE VERBINDINGEN**

Beschrijving	<p>De verspreid liggende recreatiegebieden van de Groenalliantie zijn, samen met natuur- en recreatiegebieden van andere beheerders, met elkaar verbonden door een netwerk van recreatieve fietspaden en wandelpaden. De mogelijkheid om tijdens een tocht meerdere natuur- en recreatiegebieden aan te doen is van grote waarde. Gebieden die op het eerste oog vooral bezoekers uit de directe omgeving ontvangen hebben hierdoor ook een belangrijke regionale betekenis. De volledigheid en de kwaliteit van de recreatieve verbindingen kunnen nog verder worden verbeterd. Een verkenning naar prioritaire verbindingen brengt dit in beeld en vormt de basis voor potentiële investeringen in verbindingen.</p> <p><i>Uitgangspunten voor verkenning</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Voldoende snelle en veilige verbindingen voor langzaam verkeer tussen de woonomgeving, de recreatiegebieden en het verbindende routenetwerk • Opheffen van ontbrekende schakels en verkeerskundige knelpunten in de routenetwerken voor wandelen en fietsen. • Een aantrekkelijke landschappelijke omgeving van de routes • Aantakken van andere recreatief aantrekkelijk bestemmingen in de regio zoals natuurgebieden, historische dorpen en steden en culturele bestemmingen. • Goede bewegwijzering en informatievoorziening vanaf de routes naar de recreatiegebieden 		
Aandragers	Groenalliantie, recreanten, gemeenten, gemeenteraadsleden (raadsinformatiebijeenkomst 2017)		
Resultaten	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisatie prioritaire recreatieve verbindingen • Inventarisatie van gebiedspartners en medefinanciers • Uitwerken kansen en mogelijkheden van prioritaire recreatieve verbindingen 		
Investering	<i>Planvorming</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer</i>
	€ 20.000	Eventueel op basis van verkenning	

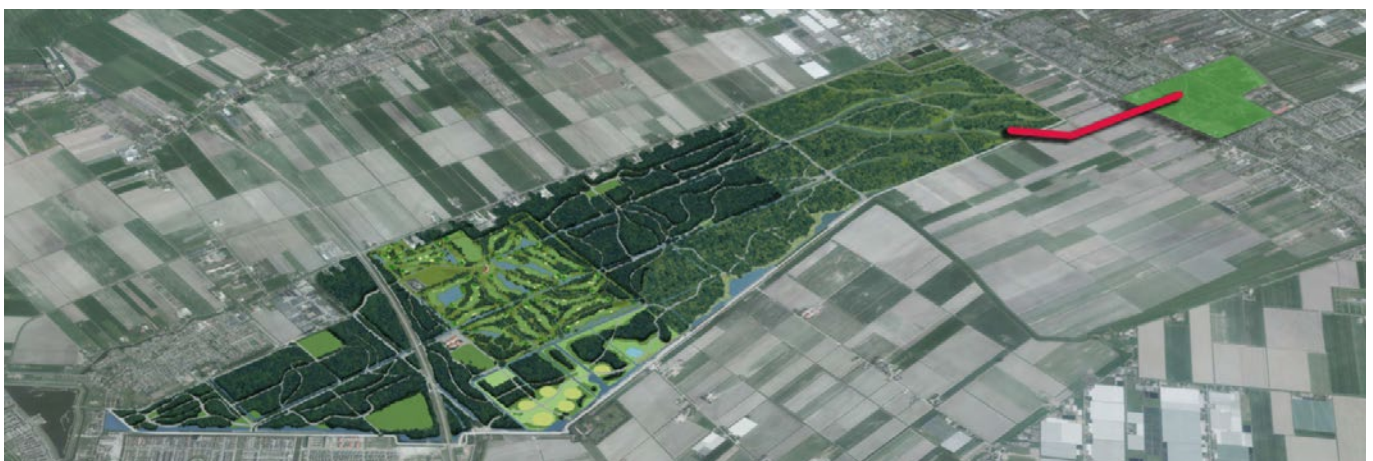

Verkennen verbinding met Bentwoud





Krimpenerhout

Projecten in uitvoering

In 2016-2018 zijn er negen projecten in de Krimpenerhout opgepakt:

- Vijf projecten rondom de entree en de zwemplas van de Krimpenerhout zijn in samenhang opgepakt. De projecten voorzien in een herinrichting van de entree inclusief informatievoorziening en een multifunctioneel gebouw, verbetering van de zwemwaterkwaliteit, versterking van routestructuren en meer variatie in bospercelen en beplanting. Uitvoering is voorzien in 2018/2019.
- Er is een mountainbikeroute in ontwikkeling (primair over het oude talud van de N210) met meerdere uitdagende parcours. Uitvoering is voorzien in 2019/2020.
- Er is een haalbaarheidsonderzoek ruiterroutes uitgevoerd in 2016/2017. De studie concludeert dat ruiterroutes (in de gebieden van de Groenalliantie) niet haalbaar zijn. Het project is daarmee afgerond.
- De omvorming van het evenemententerrein is als beheermaatregel uitgevoerd. Project is daarmee afgerond.
- In bijlage 1/Krimpenerhout is een impressie opgenomen van bovenstaande projecten in uitvoering.

Geagendeerde projecten

Met de uitvoering van vijf projecten rondom de entree en de zwemplas van de Krimpenerhout wordt meer gerealiseerd dan voorzien in de oorspronkelijk planvorming. Er worden meer speelvoorzieningen gerealiseerd, er worden meer wandelpaden aangelegd en er worden natuurvriendelijke oevers en een moeraszone aangelegd.

In de herijking van de investeringsagenda is het project 'Aanleg natuuras' komen te vervallen. De beoogde natuurdoelen worden namelijk deels gerealiseerd in de eerste investeringsronde (natuurvriendelijke oevers en moeraszone). Aanvullend worden door gerichte beheermaatregelen in de komende jaren de natuurwaarden verder versterkt. De oorspronkelijke activiteiten is beperkt tot de realisatie van bootcampvoorzieningen, een voorziening voor een doelgroep die tot nu toe in de Krimpenerhout nog onvoldoende bediend wordt.

Er blijven twee eerder geagendeerde projecten op de Investeringsagenda staan. Het aanleggen van paaltjesroutes en de aanleg van bootcampvoorzieningen. Er is lopende het proces van de kwaliteitsimpuls één nieuw project geagendeerd namelijk het realiseren van drie speelplaatsen (aanvraag vanuit gemeente Krimpen aan de IJssel). Alle geagendeerde projecten zijn in de onderstaande tabel kort toegelicht.


KRIMPENERHOUT		
In uitvoering	Reeds geagendeerd	Nieuw geagendeerd
Herinrichting zwemplas	Aanleg bootcampparcours	Aanleg van 3 speelplaatsen
Herinrichting hoofdentree en multifunctionele voorziening	Aanleg paaltjesroute	
Toevoegen communicatie- en informatievoorziening		
Versterken routestructuren		
Variatie in bospercelen en beplanting		
Omvormen evenemententerrein		
Versterking Polderpiratenpad		
Haalbaarheidsonderzoek ruiterroutes		
Mountainbikeroute		




Visiekaart Krimpenerhout

Legenda

-  Nieuwe padenstructuur
-  Moeraszone
-  Schone surfplas
-  Toekomstige uitbreiding
-  Gevarieerde bosvakken
-  Verbeterde hoofdentree
-  Bootcamp
-  Polderpiratenpad
-  Speelplaats
-  Omvormen evenemententerrein tot natuur
-  Entrees
-  Entreegebouw
-  Paaltjesroute
-  MTB route

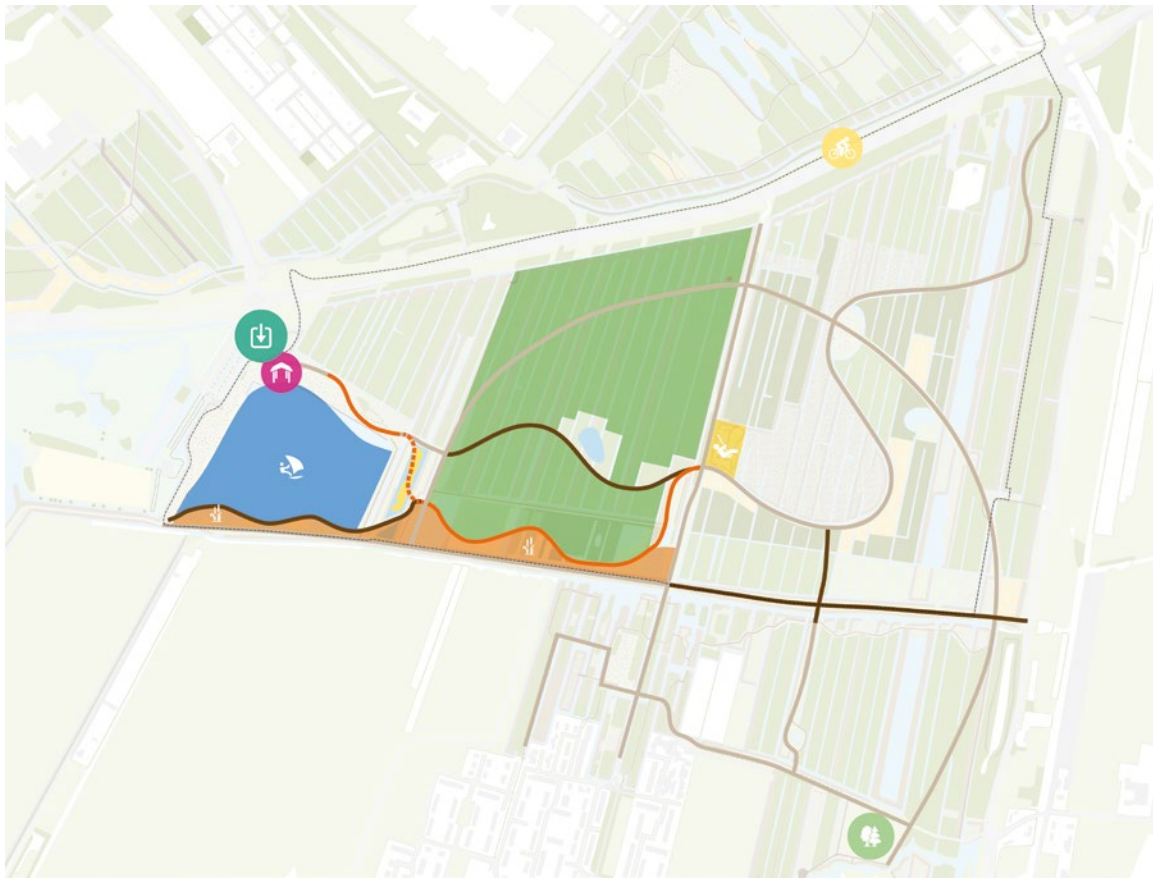

Projecten gerealiseerd, in uitvoering of in voorbereiding

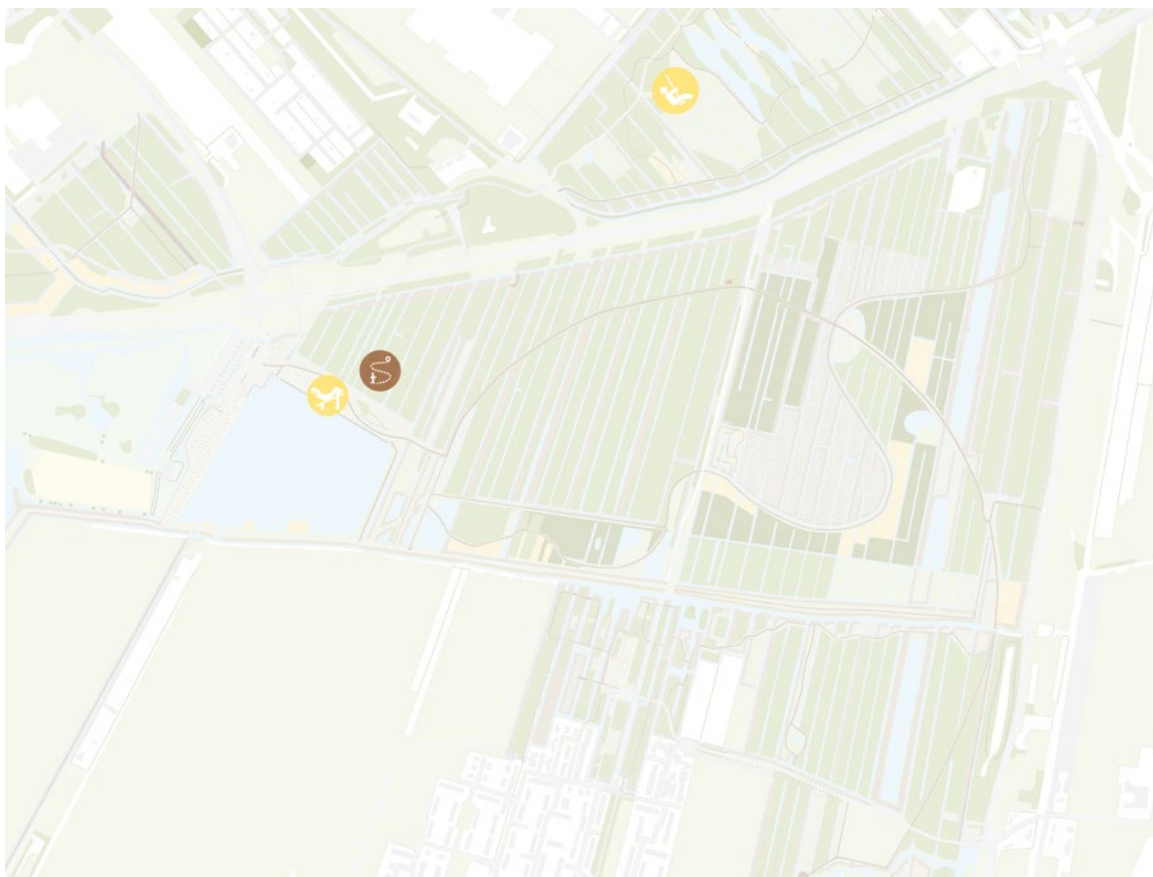

Projecten geagendeerd

PROJECT KH3		AANLEG BOOTCAMPPARCOURS	
Beschrijving	<p>In de Krimpenerhout wordt veel gesport en hard gelopen. Er zijn echter geen specifieke voorzieningen die het sporten en bewegen voor (jong) volwassenen in de buitenlucht faciliteren. Het beoogde bootcampparcours voorziet hierin, waarbij de locatie van het parcours nader zal worden bepaald. De meest geëigende locaties liggen in de intensieve zone in de nabijheid van de zwemplas of nabij de speelpolder. De invulling van het parcours met voorzieningen is niet op voorhand gedefinieerd en wordt in overleg met gebiedspartners nader ingevuld.</p> <p><i>Uitgangspunten voor ontwerp</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aanleg van een avontuurlijke bootcamp- / fitness- / trimparcours • Locatie nabij zwemplas of speelpolder • Ontwerp voorziet in diverse sportmogelijkheden • Goede landschappelijke inpassing in de omgeving • Beheer door gebiedspartners 		
Aandragers	Recreanten, Groenalliantie, gemeenten, diverse georganiseerde sportclubjes		
Resultaten	Een bootcampparcours voor sport en beweging in de buitenlucht		
Investing	<i>Planvorming (40%)</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer (8%)</i>
	€ 32.000	€ 80.000	€ 7.000




PROJECT KH13**AANLEG PAALTJESROUTE KRIMPENERHOUT**

Beschrijving	<p>In de Krimpenerhout zijn geen wandelroutes uitgezet terwijl de schaal van het gebied zich hier goed voor leent. Een paaltjesroute kan in deze leemte voorzien. Recreanten vinden paaltjesroutes aantrekkelijk vanwege de voorspelbaarheid en duidelijkheid. Paaltjesroutes hebben over het algemeen één of meerdere duidelijke startpunten, doorgaans bij een parkeergelegenheid. Bij het startpunt staat duidelijk aangegeven hoe ver de wandeling is. De wandelaar volgt simpelweg de paaltjes en komt na enige tijd weer bij het startpunt uit.</p> <p><i>Uitgangspunten</i></p> <ul style="list-style-type: none">• De paaltjesroute is te lopen zonder enige voorbereiding• De paaltjesroute biedt meerdere routes aan die variëren in afstand (van kort tot lang)• De paaltjesroute kent twee startpunten: de parkeerplaats bij de surfplas en de parkeerplaats bij Restaurant Breeka.		
Aandrag	Recreanten, Groenalliantie, gemeenten		
Resultaten	<ul style="list-style-type: none">• Aantrekkelijke paaltjesroute met twee startpunten		
Investing	<i>Planvorming (40%)</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer (5%)</i>
	€ 6.000	€ 15.000	€ 800



PROJECT KH15		AANLEG VAN DRIE SPEELPLAATSEN		
Beschrijving	De gemeente Krimpen aan den IJssel zal alle speelvoorzieningen in heel de gemeente gaan vernieuwen. Onderdeel van de vernieuwing is om enkele speelroutes te realiseren die de kinderen ook uit de wijken in het nabijgelegen groen brengt. Op drie plekken is een doortrekking van speelroutes voorzien naar de Krimpenerhout: nabij Lansingh-Zuid, nabij Boveneind en in het Energiebos. In nauwe samenwerking met de gemeente Krimpen aan den IJssel (als initiatiefnemer) wil de Groenalliantie op drie plekken speelvoorzieningen realiseren. De speelvoorzieningen maken de groengebieden ook aantrekkelijker als wandel- en fietsgebied voor jonge gezinnen.			
Aandrag	Gemeente Krimpen aan den IJssel			
Resultaten	<ul style="list-style-type: none"> Drie speelplaatsen 			
Investing	<i>Planvorming (30%)</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer (8%)</i>	
	€ 21.000	€ 70.000	€ 6.000	

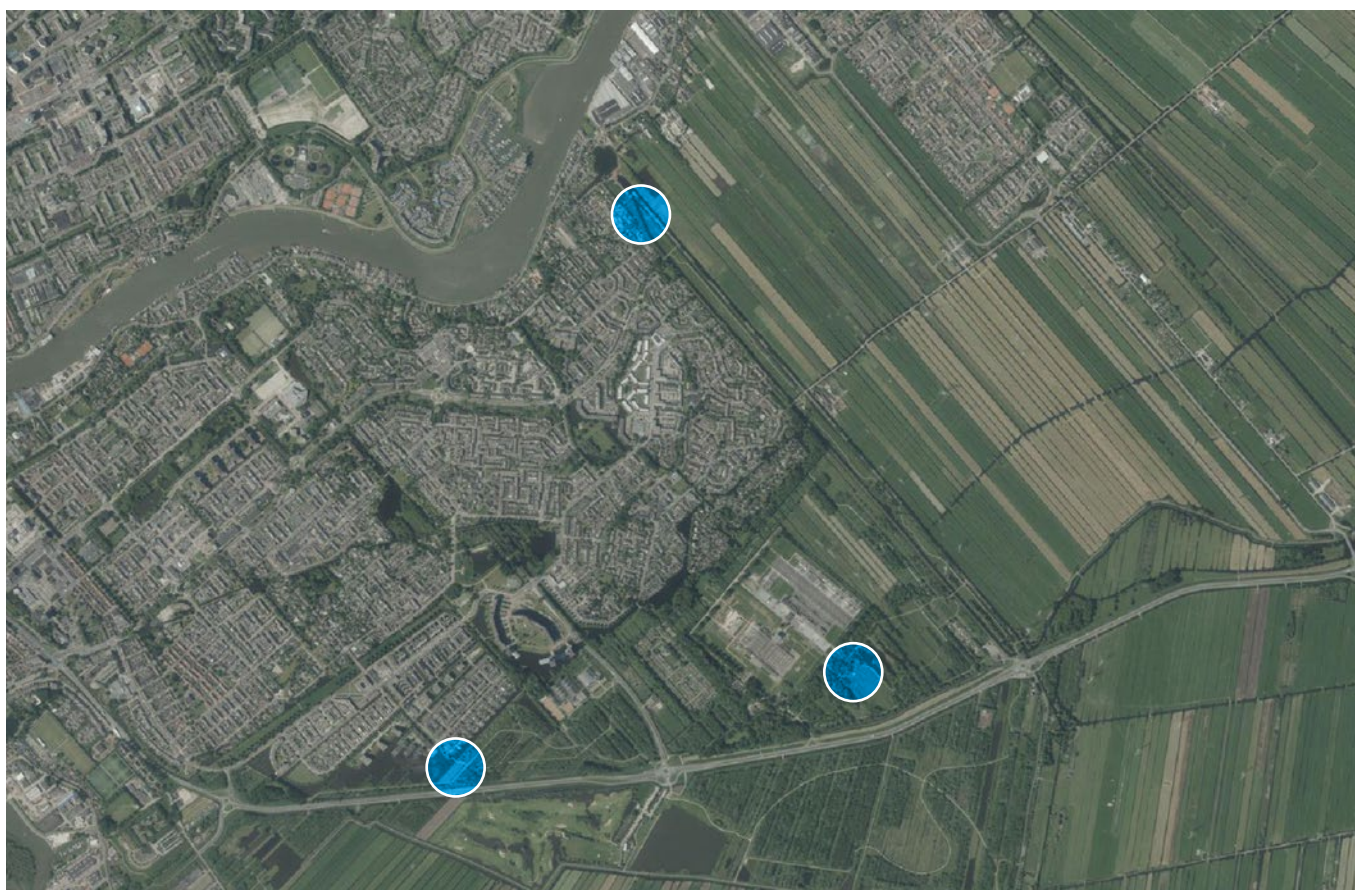





Loetbos

Projecten in uitvoering


In 2016-2018 zijn er vier projecten in de Loetbos opgepakt:

- Vier projecten rondom de entree van het Loetbos zijn in samenhang opgepakt. De projecten voorzien in een herinrichting van de entree, realisatie van themapaden en de inrichting van de centrale ruimte inclusief informatievoorziening. Aanvullend hierop is de natuur- en cultuureducatie opgepakt. Uitvoering is voorzien in 2018/2019.
- In bijlage 1/Loetbos is een impressie opgenomen van bovenstaande projecten in uitvoering.

Geagendeerde projecten

Eén project uit de Investeringsagenda is nog niet opgestart. Lopende het proces van de kwaliteitsimpuls is één nieuw project geagendeerd (zie onderstaande tabel). Alle geagendeerde projecten zijn in navolgende kort toegelicht.

LOETBOS		
In uitvoering	Reeds geagendeerd	Nieuw geagendeerd
Herinrichting hoofdentree	Realisatie uitkijktoren	Verkenning doorontwikkeling Hendrikshoeve
Herinrichting padenstructuur		
Aanleg centrale ruimte		
Toevoegen natuur- en cultuureducatie		

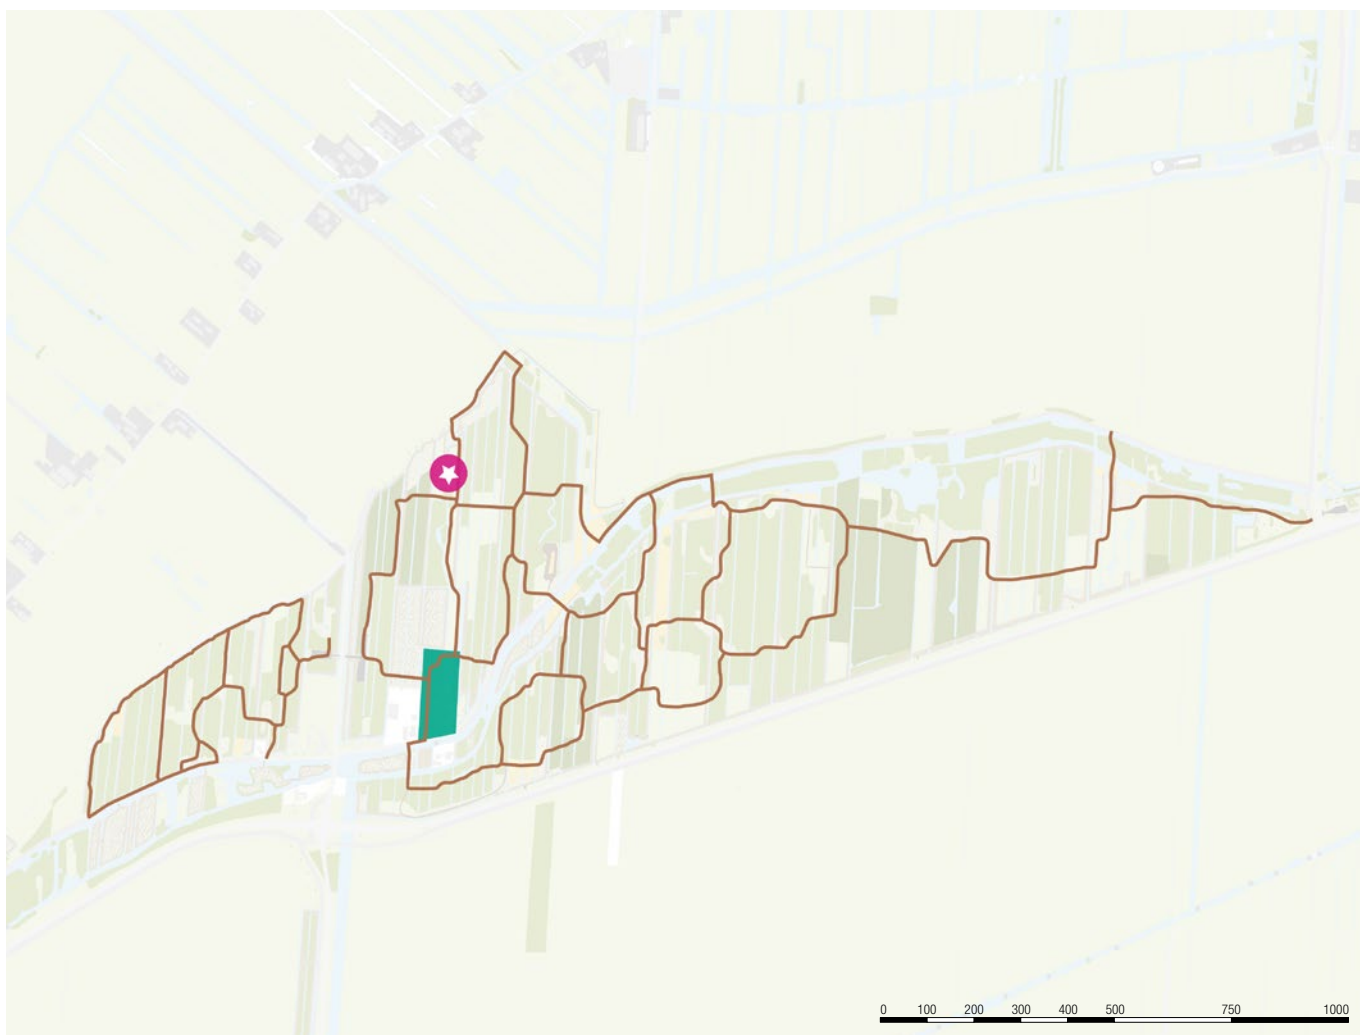

Visiekaart Loetbos

Legenda

- Samenhang hoofdentree
- Hierarchie padenstructuur
- ★ Uitkijktoren
- H Hendrikshoeve verder ontwikkelen



Projecten gerealiseerd, in uitvoering of in voorbereiding



Projecten geagendeerd

PROJECT LB17		REALISATIE UITKIJKTOREN	
Beschrijving	<p>Uitkijktorens worden steeds meer geplaatst in natuur- en recreatiegebieden. Ze bieden een mogelijkheid om natuur en landschap op een unieke wijze te beleven. Recent is er in de Krimpenerwaard een imposante uitkijktoren gerealiseerd: de Beverburcht op natuurgebied de Zaag (2018). Vanaf de brug heb je ‘een panoramisch zicht over De Zaag, Rotterdam, de haven en de rivier’. Een uitkijktoren op het unieke slagenlandschap ontbreekt echter in de Krimpenerwaard.</p> <p>Het Loetbos is een unieke plek om een uitkijktoren te realiseren die de mogelijkheid biedt tot een panoramisch zicht op het slagenlandschap van de Krimpenerwaard. De uitkijktoren kan als trekker gaan fungeren en sluit goed aan bij de recreanten die gericht zijn op natuur en landschap (groene belevingswereld).</p>		
Aandragers	Recreanten, gemeenten		
Resultaten	<ul style="list-style-type: none"> • Uitkijktoren met panoramisch zicht op het slagenlandschap van de Krimpenerwaard 		
Investing	<i>Planvorming (25%)</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer (8%)</i>
	€ 37.500	€ 150.000	€ 12.000



PROJECT LB20		VERKENNING DOORONTWIKKELING HENDRIKSHOEVE		
Beschrijving	De Hendrikshoeve is gelegen bij de entree van het Loetbos. De belangrijkste functie van de hoeve als steunpunt voor het beheerteam is niet langer nodig. Daarmee ontstaat ruimte voor nieuwe functies van de Hendrikshoeve. De toename van het aantal bezoekers van het Loetbos, het goed functionerende eenvoudig ingerichte kanoverhuurcentrum en de wensen vanuit bezoekers om binnen iets te drinken of eten geven aanleiding om een doorkijk te schetsen voor de toekomstige ontwikkeling van de Hendrikshoeve. De Hendrikshoeve kan in de toekomst nog meer fungeren als belangrijke ontmoetingsplek, rustpunt of startpunt voor recreanten door de hoeve te transformeren in een multifunctionele voorziening met behoud van de recreatieve functie. In de doorkijk zal ook worden verkend welke mogelijkheden er zijn voor samenwerking met nieuwe of bestaande partijen.			
Aandrag	Groenalliantie, Gemeenteraadsleden (raadsinformatiebijeenkomst 2017)			
Resultaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kansen en belemmeringen van nieuwe functies voor de Hendrikshoeve • Potentiele partijen waarmee de samenwerking kan worden aangegaan • Scenario's voor organisatie en financiering 			
Investering	<i>Planvorming</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer</i>	
	€ 40.000			





Reeuwijkse Hout

Projecten in uitvoering

In 2017 is het Hondenstrand gerealiseerd bij de plas. Daarnaast zijn er in 2016-2018 drie projecten in de Reeuwijkse Hout opgepakt:

- De herinrichting van de entreezone en de parkeerplaats. Uitvoering is voorzien in 2019 en een deel wordt gerealiseerd door beheermaatregelen.
- De aanleg van een speel- en avonturenroute nabij Landal en het strand. Uitvoering is voorzien in 2019.
- Er is een bebodingsplan opgesteld voor informatievoorziening. Uitvoering is voorzien in 2019.
- In bijlage 1/Reeuwijkse Hout is een impressie opgenomen van bovenstaande projecten in uitvoering.

Geagendeerde projecten

Twee projecten uit de Investeringsagenda zijn nog niet opgestart en lopende het proces van de kwaliteitsimpuls zijn er geen nieuwe projecten geagendeerd (zie onderstaande tabel). Alle geagendeerde projecten zijn in navolgende kort toegelicht.

REEUWIJKSE HOUT		
In uitvoering	Reeds geagendeerd	Nieuw geagendeerd
Aanleg hondenstrand	Herinrichting strand- en oeverzone	
Toevoegen communicatie- en informatievoorziening	Aanpassing bosstructuren en graslandbeheer	
Herinrichting entreezone en parkeerplaats		
Toevoegen speel- en avonturenroute		



Visiekaart Reeuwijkse Hout

Legenda

- Boszone
- Struweelzone
- Strandzone
- Zone voor gele leefstijl
- Terrein kleinschalige evenementen
- P Landschappelijk inpassen parkeerplaats
- i Informatiepunt, overstapplaats
- ferry Verbeteren vaarmogelijkheden
- bicycle Verbeteren fietsenstalling
- square Verbeteren entreegebied
- Fietspadenstructuur
- Wandelpadenstructuur
- dog Hondenstrand



Projecten gerealiseerd, in uitvoering of in voorbereiding



Projecten geagendeerd

PROJECT RH4		HERINRICHTING STRAND- EN OEVERZONE	
Beschrijving	<p>De strand- en oeverzone is het meest intensief gebruikte deel van de Reeuwijkse Hout. Op mooie zomerse dagen trekt het strand veel bezoekers. De recreantenstromen moeten beter worden begeleid om de beleving van alle bezoekers te vergroten. Zo zullen paden voor fietsers en wandelaars ter hoogte van het Paviljoen meer worden gescheiden. Ook buiten het zomerseizoen krijgt de strandzone een waardevolle gebruiks- en belevingswaarde.</p> <p><i>Ontwerprichtlijnen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Landschappelijke inpassing entrees strand en oeverzone • Realiseren uitkijkpunten met zitgelegenheid • Gescheiden paden voor wandelaars en fietsers nabij paviljoen 		
Aandragers	Recreanten, Groenalliantie, stakeholders		
Resultaten	<ul style="list-style-type: none"> • Representatieve strand- en oeverzone met veilige fiets- en wandelpaden 		
Investing	<i>Planvorming (30%)</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer (5%)</i>
	€ 45.000	€ 150.000	€ 8.000



PROJECT RH5		AANPASSING BOSSTRUCTUREN EN GRASLANDBEHEER	
Beschrijving	<p>De bosvakken in de Reeuwijkse Hout hebben een enigszins eentonige opbouw met weinig contrasten en een beperkte soortensamenstelling. Dit gaat ten koste van de belevingswaarde van de Reeuwijkse Hout. Door in te zetten op de aanpassing van de bosstructuren en het graslandbeheer kan de landschappelijke beleving worden versterkt en neemt de biodiversiteit toe. De ecologische- en belevingswaarde van de bospercelen wordt vergroot door bosrandzones te ontwikkelen met zoom- en mantelvegetatie. Het graslandbeheer sluit aan bij de verschillende belevingswerelden: gevarieerder in de entreezone tot meer natuurlijk in het meest westelijke deel. Dit project wordt afgestemd op de maatregelen voor de essentaksterfte en zal deels worden gerealiseerd door beheermaatregelen.</p> <p><i>Uitgangspunten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkelen zoom- en mantelvegetatie langs bosvlakken waar mogelijk • Bevorderen van ondergroei in bossen • Natuurlijke opbouw oevers • Plaatselijk aangepast maaibeheer 		
Aandragers	Recreanten, Groenalliantie, stakeholders, beheerteam groene hart		
Resultaten	<ul style="list-style-type: none"> • Meer gevarieerd en contrastrijk landschapsbeeld met hogere soortenrijkdom • Verhoging landschappelijke beleving 		
Investing	<i>Planvorming (15%)</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer</i>
	€ 22.500	€ 150.000	Budgetneutraal





Goudse Hout

Projecten in uitvoering

In 2016-2018 zijn er drie projecten in de Goudse Hout opgepakt:

- Herinrichting van de hoofdentree van de Goudse Hout ter hoogte van het Kale Jonkerpad. Uitvoering is voorzien in 2019.
- Aanleg van een natuurspeelplaats. Uitvoering is voorzien in 2019.
- Er is een bebodingsplan opgesteld voor informatievoorziening. Uitvoering is voorzien in 2019.
- In bijlage 1/Goudse Hout is een impressie opgenomen van bovenstaande projecten in uitvoering.

Geagendeerde projecten

Vier projecten uit de Investeringsagenda zijn nog niet opgestart. Lopende het proces van de kwaliteitsimpuls zijn twee nieuwe projecten geagendeerd (zie onderstaande tabel). Alle geagendeerde projecten zijn in navolgende kort toegelicht.

GOUDSE HOUT		
In uitvoering	Reeds geagendeerd	Nieuw geagendeerd
Herinrichting entreegebied Goudse Houtsingel	Herinrichting padenstructuur	Herinrichting entree Achterwillensebocht
Toevoegen communicatie- en informatievoorziening	Ontwikkelingskader stadstuin Goudse Hout opstellen	
Aanleg natuurspeelplaats	Aanpassing bosstructuren en graslandbeheer	
	Herinrichting entree Platteweg	



Visiekaart Goudse Hout

Legenda

- Boszone
- Struweelzone
- Verbeteren entree gebied
- Speelplaats
- Stadstuin verder ontwikkelen
- Verbeterde entree heemtuin
- P Landschappelijk inpassing parkeerplaats
- Plein / zichtlijn
- ★ Markant punt
- Fietspad
- Wandelpad



Projecten gerealiseerd, in uitvoering of in voorbereiding



Projecten geagendeerd

PROJECT GH2		HERINRICHTEN PADENSTRUCTUUR		
Beschrijving	<p>De Goudse Hout heeft een uitgebreid netwerk van paden. Er zijn enkele knelpunten die moeten worden aangepakt. Het gaat hierbij met name om het ontbreken van een verhard pad in het weidedeel van de Goudse Hout en op enkele plaatsen ontbreken onderliggende struipaden die het mogelijk maken om 'rondjes' te lopen. Met de aanpak van deze knelpunten wordt er een duidelijker onderscheid gemaakt tussen de hoofdpadenstructuur enerzijds en de struipaden anderzijds.</p> <p><i>Ontwerprichtlijnen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Maak een duidelijk onderscheid tussen de hoofdpadenstructuur en onderliggende onverharde struipaden • Versterk de padenstructuur waarbij de kavelstructuur van de Goudse Hout leidend is en meer mogelijkheden ontstaan om verschillende rondjes te lopen • Realiseer een wandelverbinding via een vlonderpad door de grote plas (in samenhang met verkennen verbetering waterkwaliteit). 			
Aandrag	Recreanten, Groenalliantie			
Resultaten	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe padenstructuur Goudse Hout met duidelijk onderscheid in hoofdpaden en struipaden 			
Investing	<i>Planvorming (15%)</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer (5%)</i>	
	€ 30.000	€ 200.000	€ 10.000	



PROJECT GH3		OPSTELLEN ONTWIKKELINGSKADER STADSTUIN GOUDSE HOUT		
Beschrijving	<p>Het huidige cluster van heemtuin en volkstuinten heeft de potentie om zich in de tijd door te ontwikkelen tot 'Stadstuin'. De Groenalliantie zal voor deze doorontwikkeling een kader ontwikkelen waarbinnen gebiedspartijen worden uitgenodigd om met initiatieven te komen. Het kader schetst een beeld van de gewenste ontwikkeling en de voorwaarden waarbinnen de Groenalliantie actief initiatieven zal ondersteunen.</p> <p><i>Uitgangspunten voor ontwikkelingskader:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Toevoeging van een pluk- en proeftuin en voedselbos • Fysieke verbindingen tussen heemtuin en volkstuinten • Speelvoorziening in combinatie met stadstuin (kinderen 4-8 jaar) • Kleinschalige horeca (bij bestaande verenigingen / ondernemers) • Mogelijkheid van cofinanciering door Groenalliantie • Kadern voor meerjarig beheer 			
Aandragers	Bezoekers, Groenalliantie, stakeholders, vrijwilligers van heemtuin en volkstuinten			
Resultaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kader voor ontwikkeling Stadstuin 			
Investing	<i>Planvorming</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer</i>	
	€ 25.000			



PROJECT GH5**AANPASSING BOSSTRUCTUREN EN GRASLANDBEHEER****Beschrijving**

De bosvakken van de Goudse Hout hebben een enigszins eentonige opbouw met weinig contrast en een beperkte soortensamenstelling. Dit gaat ten koste van de belevingswaarde van de Goudse Hout. Daarnaast is er een opgave voor het toevoegen van een groene verdichting langs de randen van de Goudse Hout zodat het zicht op storende bebouwing aan met name de Platteweg ontnomen wordt. Tot slot laat de waterkwaliteit in Goudse Hout te wensen over. Dat geldt in het bijzonder nabij de nieuwe natuurlijke speelplaats. Door het toevoegen van bosvakken, het realiseren van zoom- en mantelvegetaties langs de bosvakken en een diverser en natuurlijker graslandbeheer wordt de landschappelijke structuur versterkt. De aanpassing van bosstructuren en graslandbeheer worden afgestemd met omvormingsmaatregelen en met maatregelen in het kader van de essentaksterfte. Realisatie van de ambities zal deels gebeuren via meerjarige beheermaatregelen.

Uitgangspunten

- Maak waar mogelijk zoom- en mantelvegetatie langs bosranden
- Bevorder ondergroei in bossen
- Toevoegen groene verdichting langs randen Goudse Hout
- Meer natuurlijke opbouw van oevers
- Onderzoeken verbetermaatregelen waterkwaliteit nabij natuurlijke speelplaats
- Verschraling van graslanden
- Stem bosstructuren en graslandbeheer af op de (herziene) padenstructuur
- Gerichte beheermaatregelen om zichtlijnen in stand te houden

Aandragers

Recreanten, Groenalliantie, stakeholders

Resultaten

- Groene afscherming van de Goudse Hout
- Meer gevarieerd en contrastrijk landschapsbeeld met hogere soortenrijkdom
- Verhoging landschappelijke beleving
- Verbetering waterkwaliteit

Investing

Planvorming (15%)

Uitvoering

Beheer

€ 22.500

€ 150.000

Budgetneutraal



PROJECT GH6		HERINRICHTING ENTREE PLATTEWEG		
Beschrijving	De ingang van de Goudse Hout aan de Platteweg heeft weinig kwaliteit. Het lijkt nu op een achteringang. Maar deze ingang is een belangrijke entree voor bezoekers die vanuit het plassegebied komen. De entree wordt heringericht waarbij de landschappelijke aankleding versterkt en een fietsenstalling gerealiseerd wordt.			
Aandragers	Recreanten, Groenalliantie, stakeholders			
Resultaten	<ul style="list-style-type: none"> • Representatieve entree Platteweg met fietsenstalling 			
Investing	<i>Planvorming (30%)</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer (5%)</i>	
	€ 30.000	€ 100.000	€ 5.000	

PROJECT GH8		HERINRICHTING ENTREE ACHTERWILLENSEBOCHT		
Beschrijving	De ingang van de Goudse Hout ter hoogte van de Achterwillensebocht heeft geen uitnodigende uitstraling. Het is één van de twee hoofdingangen van de Goudse Hout. De entree moet heringericht worden zodat entree, parkeerplaats, fietsparkeerplaats, informatievoorziening beter landschappelijk ingepast zijn en bezoekers zich welkom voelen in de Goudse Hout			
Aandragers	Recreanten, Groenalliantie			
Resultaten	<ul style="list-style-type: none"> • Representatieve entree met parkeerplaats en fietsenstalling 			
Investing	<i>Planvorming (30%)</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer (5%)</i>	
	€ 24.000	€ 80.000	€ 4.000	





Gouwebos

Projecten in uitvoering

In 2016-2018 zijn er drie projecten in de Gouwebos opgepakt:

- De herstructurering van bossen, graslanden en paden. Gezien de massale essentaksterfte in het Gouwebos moeten de plannen nader worden afgestemd op de maatregelen in het kader van de essentaksterfte. Het project is daarom 'on hold' gezet.
- Er is een bebordingsplan opgesteld voor informatievoorziening. Uitvoering is voorzien in 2019.
- Aanleg van een natuurspeelplaats. Uitvoering is voorzien in 2019.
- In bijlage 1/Gouwebos is een impressie opgenomen van bovenstaande projecten in uitvoering.

Geagendeerde projecten

In het Gouwebos staat alleen het project 'opwaardering speelvoorziening Boskoopzijde' geagendeerd.

GOUWEBOS		
In uitvoering	Reeds geagendeerd	Nieuw geagendeerd
Aanpassing bosstructuur, graslanden en paden	Opwaarderen speelvoorziening Boskoopzijde	
Toevoegen communicatie- en informatievoorziening		
Aanleg natuurspeelplaats		



Visiekaart Gouwebos

Legenda

- Boszone
- Struweelzone
- Recreatief grasveld
- Natuurspeelplaats
- Oevers beleefbaar maken
- Lanenstructuur versterken
- Open middengebied



Projecten gerealiseerd, in uitvoering of in voorbereiding



Projecten geagendeerd

PROJECT GB2		OPWAARDEREN SPEELVOORZIENING BOSKOOPZIJDE		
Beschrijving	Aan de noordzijde van het Gouwebos (Boskoop-zijde) is de speelvoorziening toe aan een opwaardering. De huidige speelplaats bestaat uit één speeltoestel en een vervallen basketbalveld en biedt weinig speelmogelijkheden voor de doelgroepen 4-8 jaar en 8-12 jaar. Een meer natuurlijke en avontuurlijke inrichting past beter in het landschap en daagt kinderen uit om het Gouwebos te verkennen.			
Aandragers	Recreanten, Groenalliantie, gemeenten			
Resultaten	<ul style="list-style-type: none"> Natuurlijke speelplaats aan de Boskoopzijde 			
Investing	<i>Planvorming (40%)</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer (8%)</i>	
	€ 20.000	€ 50.000	€ 4.000	







Twaalfmorgen

Projecten in uitvoering


De herinrichting van de daghaven is gerealiseerd. In 2016-2018 zijn vijf projecten opgepakt:

- De entree van Twaalfmorgen wordt heringericht inclusief de zone voor naaktrecreatie en de communicatie- en informatievoorziening (bebordingsplan). Uitvoering is voorzien in 2019.
- Bos, bosvlakken en graslandbeheer wordt voor geheel Twaalfmorgen als beheermaatregel de komende jaren doorgevoerd.
- In bijlage 1/Twaalfmorgen is een impressie opgenomen van bovenstaande projecten in uitvoering.

Geagendeerde projecten

Voor Twaalfmorgen zijn er geen (nieuwe) projecten geagendeerd.

TWAALFMORGEN		
In uitvoering	Reeds geagendeerd	Nieuw geagendeerd
Herinrichting daghaven		
Aanpassing bosvlakken en graslandbeheer		
Toevoegen communicatie- en informatievoorziening		
Herinrichting entreezone		
Aanleg voorzieningen naaktrecreatie		

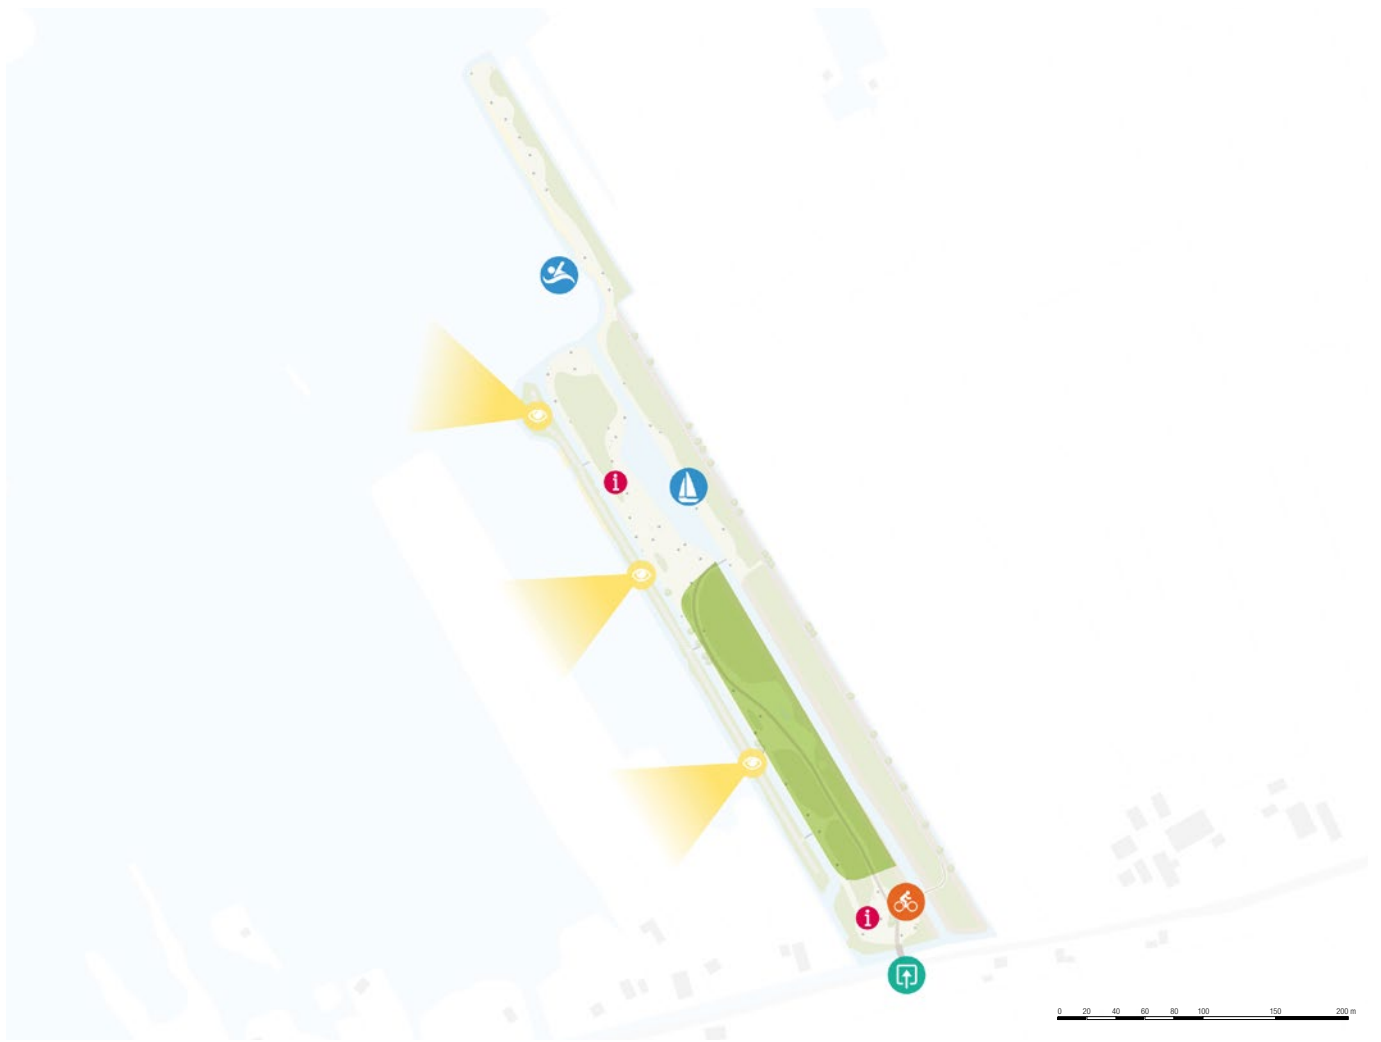

Visiekaart Twaalfmorgen

Legenda

- Middendeel opener met solitaire bomen, pad vernieuwen
- ↶ Entree opener maken
- 🚲 Fietsenstalling
- 👁️ Doorkijkjes maken
- ⚓ Daghaven oevers vernieuwen
- 🏊 nieuwe zwemtrap bij naaktstrand

Alle projecten zijn gerealiseerd of worden momenteel uitgevoerd.





't Weegje / Oostpolder

Projecten in uitvoering

In de Oostpolder is een informatiebord gerealiseerd met de geschiedenis van de polder (2018). In 't Weegje is een vogelkijkscherm gerealiseerd (2017). Verder zijn er in 2016-2018 twee projecten in 't Weegje/Oostpolder opgepakt:

- Herinrichting entreegebied 't Weegje. Uitvoering is voorzien in 2019.
- Er is een bebodingsplan opgesteld voor informatievoorziening. Uitvoering is voorzien in 2019.
- In bijlage 1/'t Weegje/Oostpolder is een impressie opgenomen van bovenstaande projecten in uitvoering.

Geagendeerde projecten

Twee projecten uit de Investeringsagenda zijn nog niet opgestart. Lopende het proces van de kwaliteitsimpuls zijn geen nieuwe projecten geagendeerd (zie onderstaande tabel). Alle geagendeerde projecten zijn in navolgende kort toegelicht (beschrijving, aandragers, resultaten, investeringen).


'T WEEGJE / OOSTPOLDER		
In uitvoering	Reeds geagendeerd	Nieuw geagendeerd
Herinrichting entreegebied	Verkenning herinrichting spoorzone	
Toevoegen communicatie- en informatievoorziening	Aanleg wandel- en fietsroute ten oosten Wilhelminakade	
Aanleg informatiebord		
Aanleg Vogelkijkscherm		



Visiekaart 't Weegje / Oostpolder

Legenda

- Natuurlijk beheer, aansluiting gebied, veilige parkeerplaats en informatie
- Spoorzone: goede verbinding creëren, verkennen mogelijkheden verlichting
- Landschappelijk inpassen parkeerplaats en (natuur-) speelplaats
- Verkennen veilig kruispunt
- Verbeteren entrees
- (Ver-)plaatsen vogelkijscherm
- Creëren doorkijkjes tussen beplanting
- Verbeterde wandel- en fietsverbinding

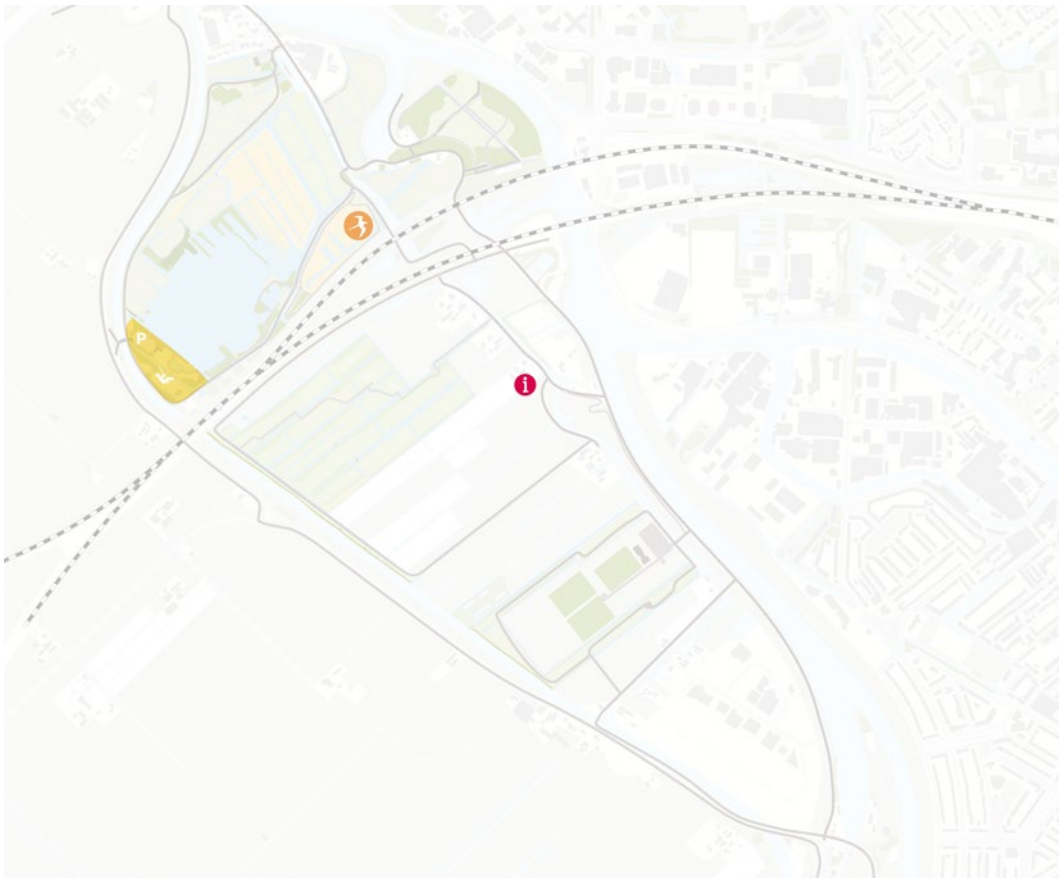

Projecten gerealiseerd, in uitvoering of in voorbereiding



Projecten geagendeerd

PROJECT WO3**VERKENNING HERINRICHTING SPOORZONE**

Beschrijving	<p>De verbindingroute tussen 't Weegje en de Oostpolder heeft ter hoogte van de spoorzone een onplezierige en sociaal onveilige uitstraling. Dat gaat ten koste van het gebruik van deze route en beide aanliggende recreatiegebieden. Een herinrichting lijkt op zijn plaats. De spoorzone is echter geen grondbezit van de Groenalliantie maar van Prorail. De opgave voor de Groenalliantie is om de knelpunten in de spoorzone expliciet te benoemen en maatregelen voor te stellen inclusief een kostenindicatie voor investeringen en beheer. Op basis van de verkenning kan de Groenalliantie in overleg treden met de grondeigenaar en beheerder Prorail. De inzet: komen tot een gezamenlijke voorstel voor herinrichting inclusief financieringsvoorstel. Een uitvoeringsvoorstel inclusief financieringsvraag wordt na de verkenning voorgelegd aan het bestuur.</p> <p><i>Uitgangspunten verkenning</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Landschappelijke herinrichting door het vergroten van de openheid en het maken van doorzichten • Aanbrengen van heldere bewegwijzering • Aanbrengen van verlichting om de sociale veiligheid te vergroten • Financieringsvraag voor investering en meerjarig beheer • Afspraken met Prorail als grondeigenaar 		
Aandragers	Recreanten, Groenalliantie, gemeenten		
Resultaten	<ul style="list-style-type: none"> • Goede verbindingroute tussen Oostpolder en 't Weegje 		
Investering	<i>Planvorming</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer</i>
	€ 10.000		



PROJECT WO5		AANLEG WANDEL- EN FIETSRROUTE TEN OOSTEN WILHELMINAKADE		
Beschrijving	<p>Het gebiedsdeel ten oosten van de Wilhelminakade ligt afgezonderd van de rest van het 't Weegje. De 'entree' en routes zijn onherkenbaar en weinig uitnodigend. Het gevolg is dat een waardevol deelgebied niet wordt benut als natuur- en recreatiegebied. Met het aanbrengen van een verbeterde wandel- en fietsverbinding wordt de gebruiks- en belevingswaarde van 't Weegje vergroot.</p> <p><i>Ontwerprichtlijnen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aanleg wandel- en fietsroute tussen het westelijk en het noordoostelijke deel van 't Weegje • Herinrichten en zichtbaar maken van de toegang (oogt nu als privéterrein) • Herinrichting parkeerplaats 			
Aandrag	Recreanten, Groenalliantie			
Resultaten	<ul style="list-style-type: none"> • Wandel- en fietsverbinding ten oosten van de Wilhelminakade van 't Weegje 			
Investing	<i>Planvorming (40%)</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer (5%)</i>	
	€ 20.000	€ 50.000	€ 2.000	



Elfhoeven

Projecten in uitvoering


In 2016-2018 is er één project in Elfhoeven opgepakt:

- Er is een bebodingsplan opgesteld voor informatievoorziening. Uitvoering is voorzien in 2019.

Geagendeerde projecten




Voor Elfhoeven staat de herinrichting van het entreegebied nog op de Investeringsagenda. Op verzoek van raadsleden is hieraan één element toegevoegd: het verlengen van het voetpad Elfhoeven (zie onderstaande tabel). De herinrichting van de entree is in navolgende kort toegelicht.

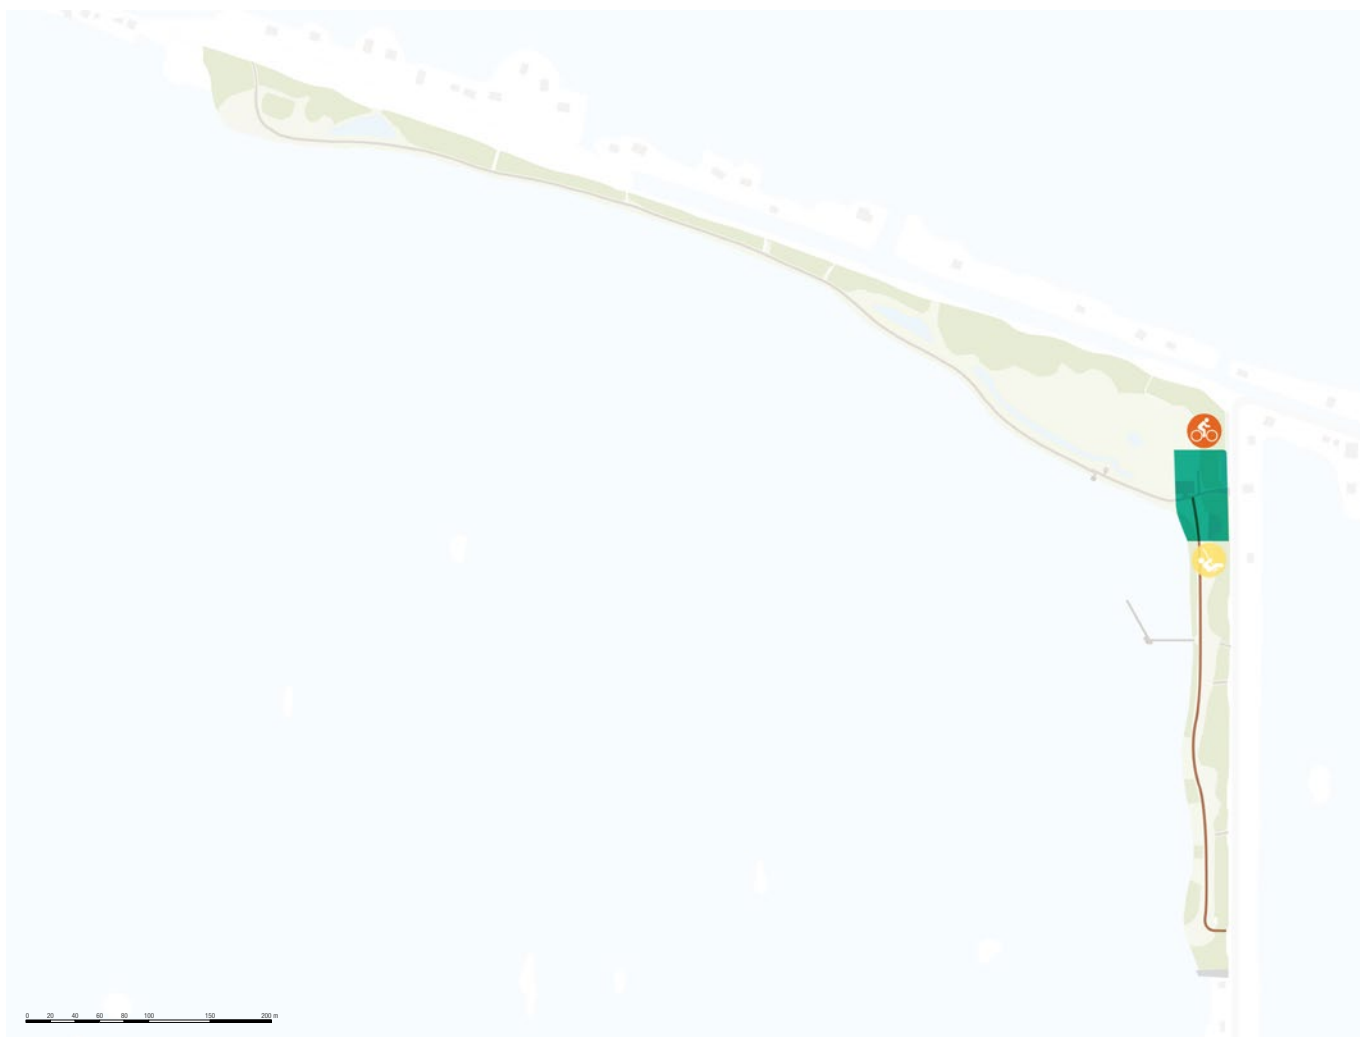
ELFHOEVEN		
In uitvoering	Reeds geagendeerd	Nieuw geagendeerd
Toevoegen communicatie- en informatievoorziening	Herinrichten entreegebied	




Visiekaart Elfhoeven

Legenda

-  Entreegebied inrichten
-  Fietsenstalling
-  Speelplaats

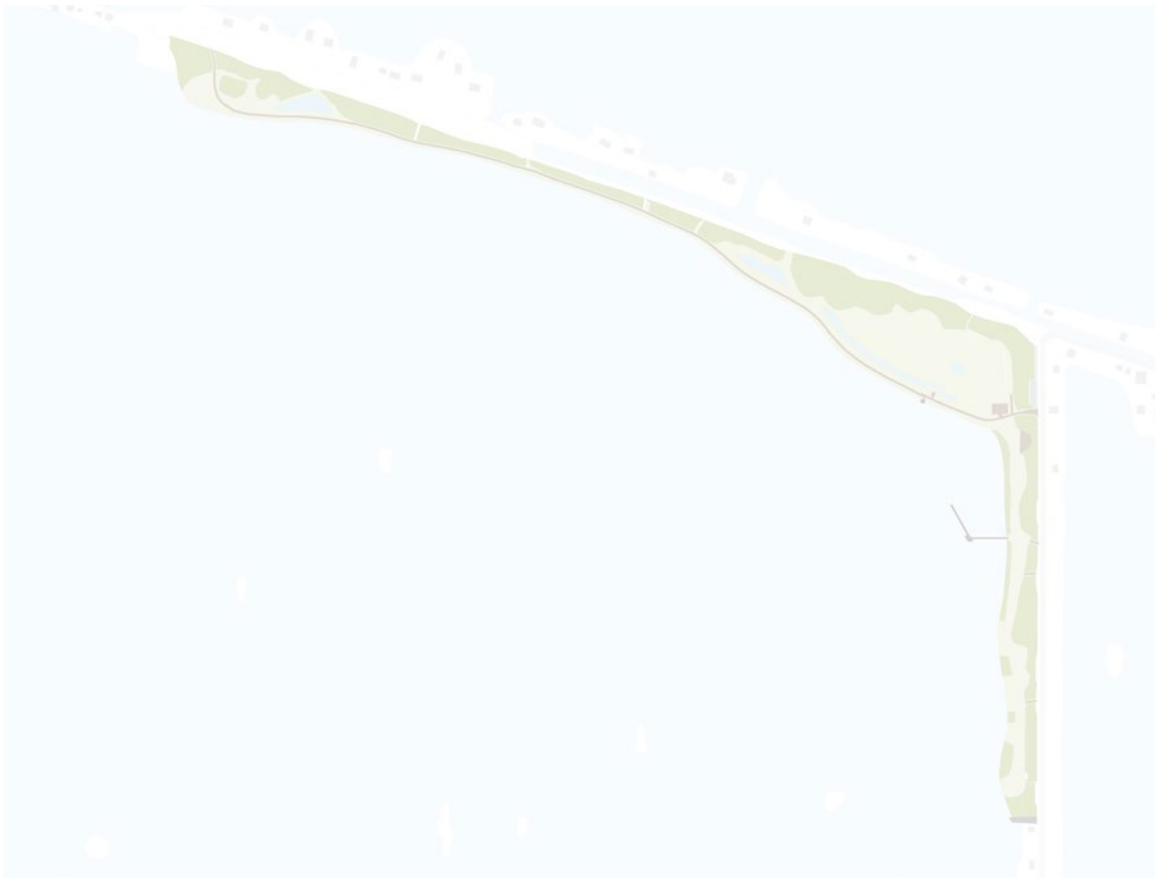

Projecten gerealiseerd, in uitvoering of in voorbereiding

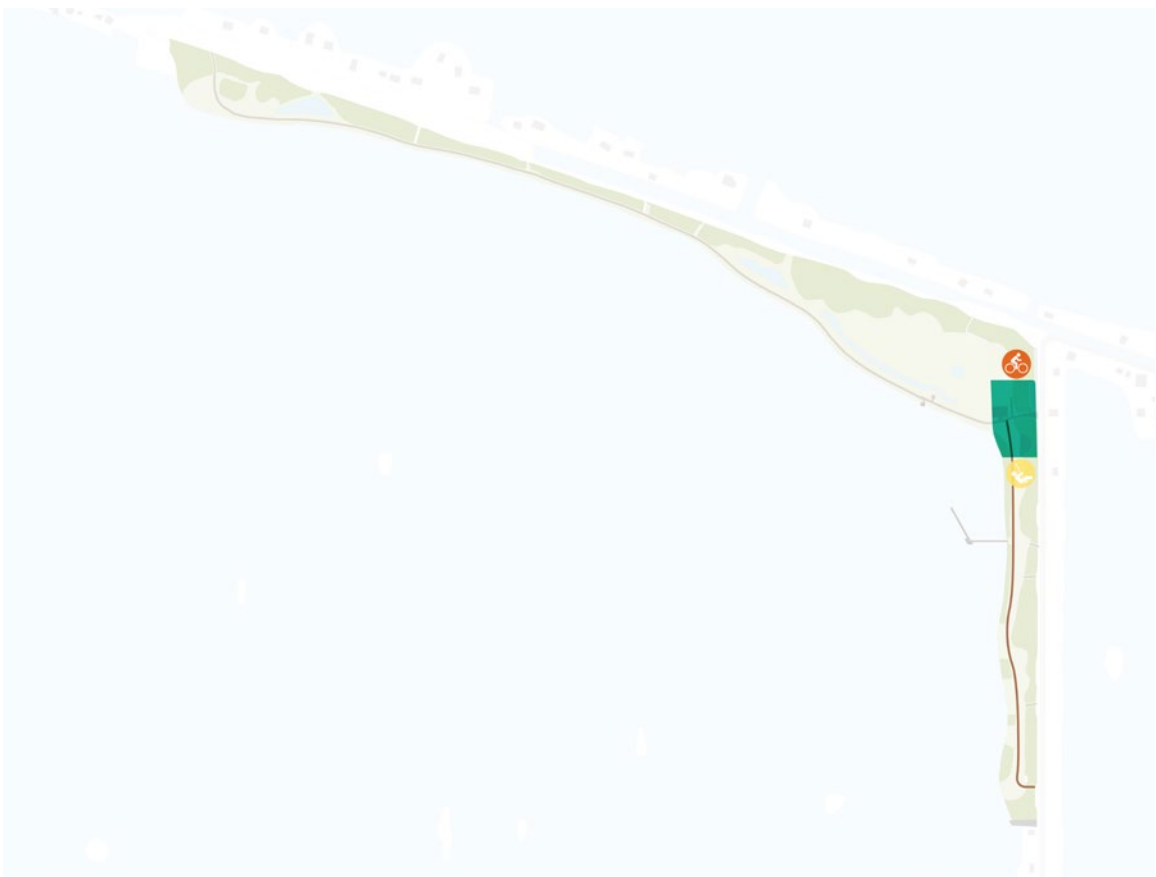

Projecten geagendeerd

PROJECT EH1		HERINRICHTEN ENTREEGEBIED		
Beschrijving	<p>De entreezone van Elfhoeven is landschappelijk rommelig, weinig herkenbaar en ontbreekt enkele voorzieningen. De herinrichting van het entreegebied voorziet in een betere landschappelijke inpassing, het toevoegen van een fietsenstalling en een speelvoorziening. Tevens wordt verkend of een sanitaire voorziening gerealiseerd kan worden die hufterproof is. In aanvulling op de herinrichting van de entree wordt het voetpad Elfhoeven verlengd.</p> <p><i>Ontwerprichtlijnen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Landschappelijke herinrichting entreegebied • Toevoegen fietsenstalling • Toevoegen speelvoorziening • Verkenning sanitaire voorziening • Verlengen voetpad zuidzijde 			
Aandragers	Groenalliantie, gemeenten, raadsleden (raadsinformatiebijeenkomst (2017), Stichting VEEN)			
Resultaten	<ul style="list-style-type: none"> • Representatieve entree met fietsenstalling en speelvoorziening • Langer voetpad op Elfhoeven 			
Investing	<i>Planvorming (40%)</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Beheer (5%)</i>	
	€ 24.000	€ 60.000	€ 3.000	







Bijlage 1: Projecten in uitvoering



In het kader van de kwaliteitsimpuls Groenalliantie zijn in de periode 2016-2018 tientallen projecten opgestart. Onderstaande tabel biedt een overzicht van deze projecten. De projecten zijn reeds uitgevoerd,

zijn in uitvoering of zitten in de aanbestedingsfase. Op de navolgende pagina's is een impressie gegeven van genoemde projecten.

OVERZICHT PROJECTEN IN UITVOERING KWALITEITSIMPULS GROENALLIANTIE (2016-2018)			
Gebied	Versterken structuren	Toevoegen voorzieningen	Realiseren verbindingen
Gebieds-overschrijdend	Schapsverordening en hondenbeleid		
	Communicatie en informatievoorziening		
Krimpenerhout	Herinrichting zwemplas	Haalbaarheidsonderzoek ruiterroutes	
	Herinrichting hoofdentree en multifunctionele voorziening	Mountainbikeroute	
	Versterken routestructuren	Versterking Polderpiratenpad	
	Variatie in bospercelen en beplanting		
	Toevoegen informatievoorziening		
	Omvormen evenemententerrein		
Loetbos	Herinrichting hoofdentree	Toevoegen natuur- en cultuureducatie	
	Herinrichting padenstructuur		
	Aanleg centrale ruimte		
Reeuwijkse Hout	Herinrichting entreezone	Aanleg hondenstrand	
	Toevoegen informatievoorziening	Toevoegen speel- en avonturenroute	
Goudse Hout	Herinrichting entreegebied Goudse Houtsingel	Aanleg natuurspeelplaats	
	Toevoegen informatievoorziening		
Gouwebos	Aanpassing bosstructuur, graslanden en paden	Aanleg natuurspeelplaats	
	Toevoegen informatievoorziening		
Twaalfmorgen	Herinrichting daghaven	Aanleg voorzieningen naaktrecreatie	
	Aanpassing bosvlakken en graslandbeheer		
	Herinrichting entreezone		
	Toevoegen informatievoorziening		
't Weegje / Oostpolder	Herinrichting entreegebied	Aanleg informatiebord	
	Herinrichting entreegebied	Aanleg Vogelkijkscherm	
Elfhoeven	Toevoegen informatievoorziening		

Communicatie en informatievoorziening

Beeldtaal voor alle gebieden

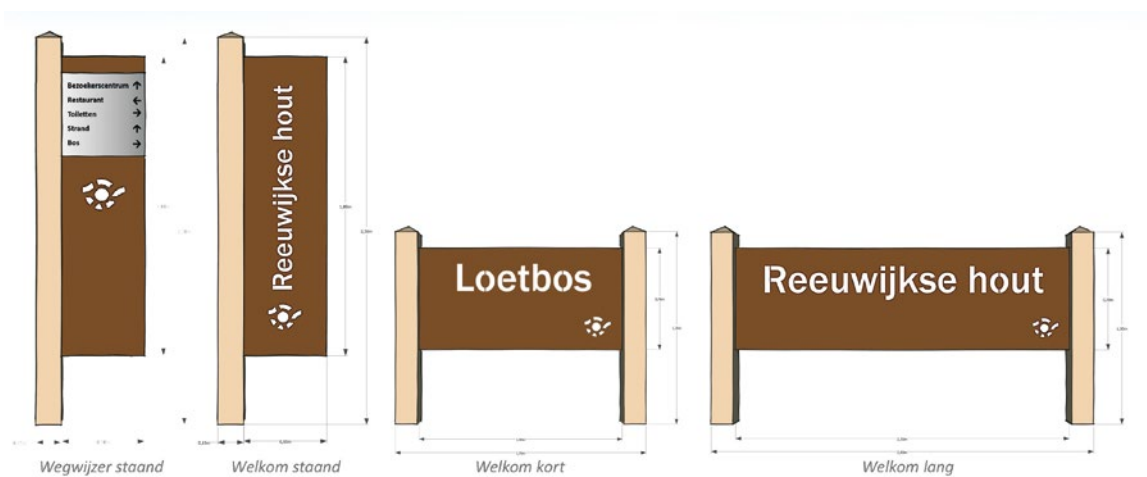
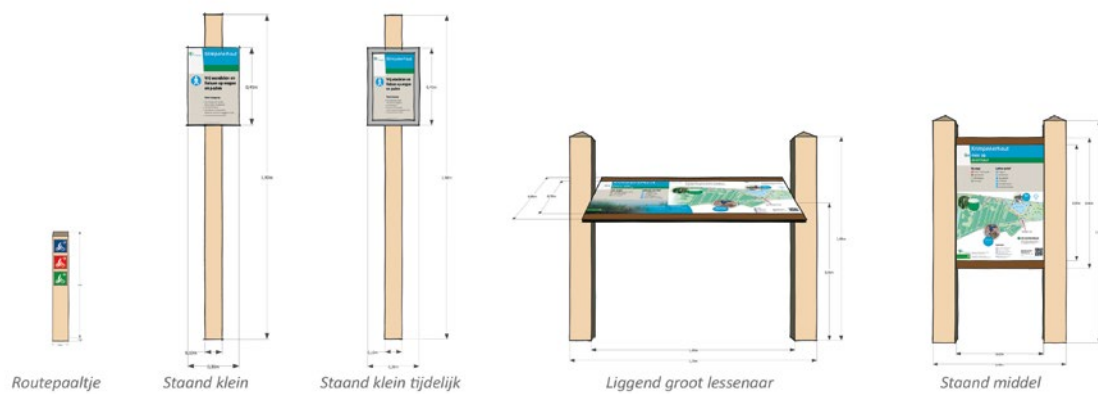


Krimpenerhout

Herinrichting zwemplas



Afzanden van de plas

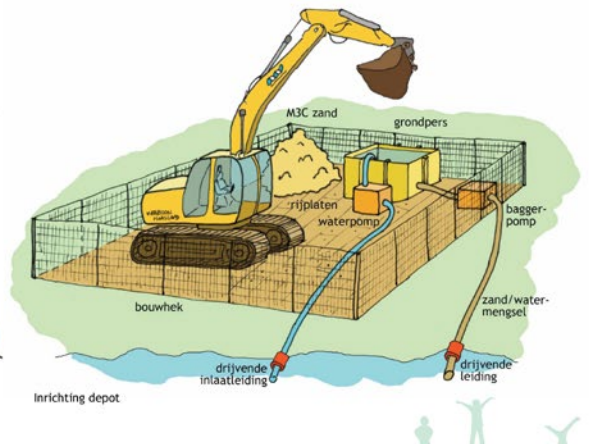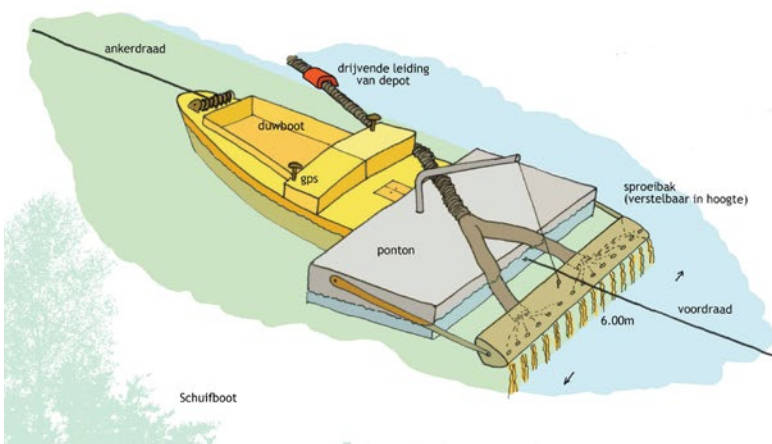




Krimpenerhout

Herinrichting hoofdentree





Krimpenerhout

Aanleg natuurspeeleiland

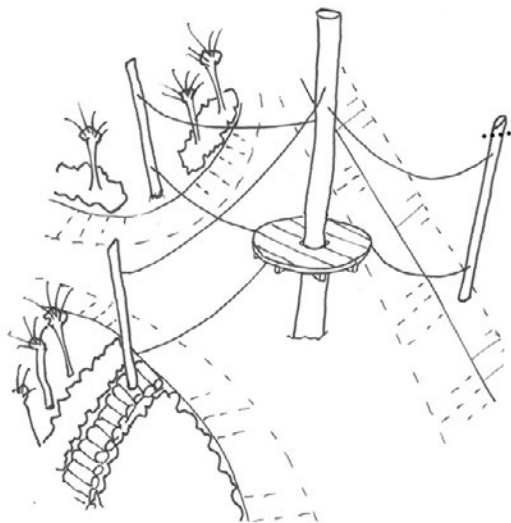


Krimpenerhout

MTB-route

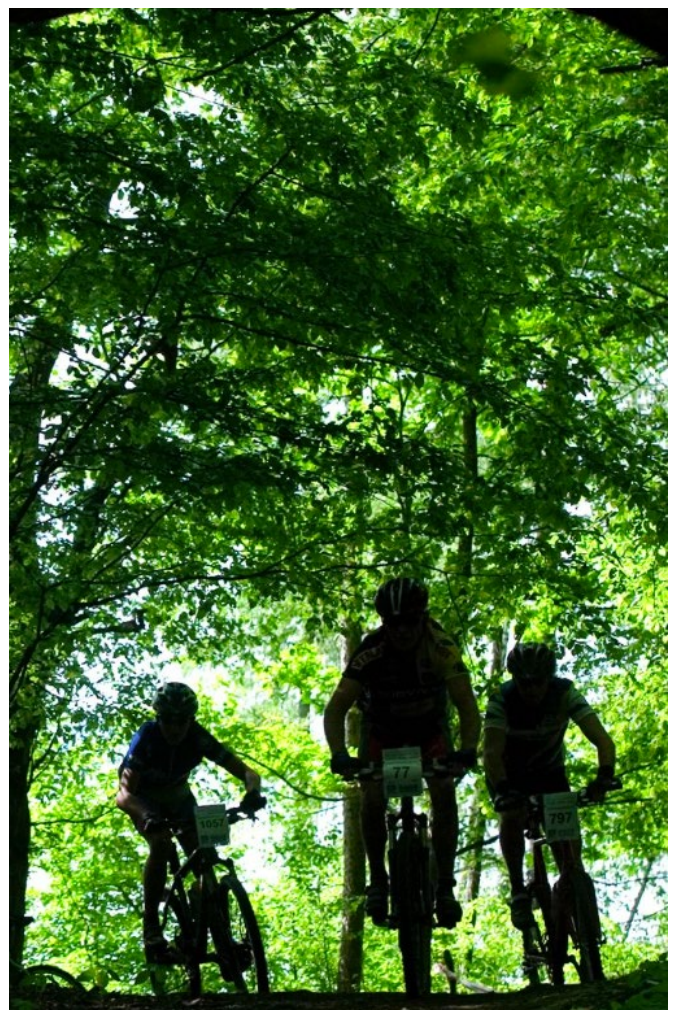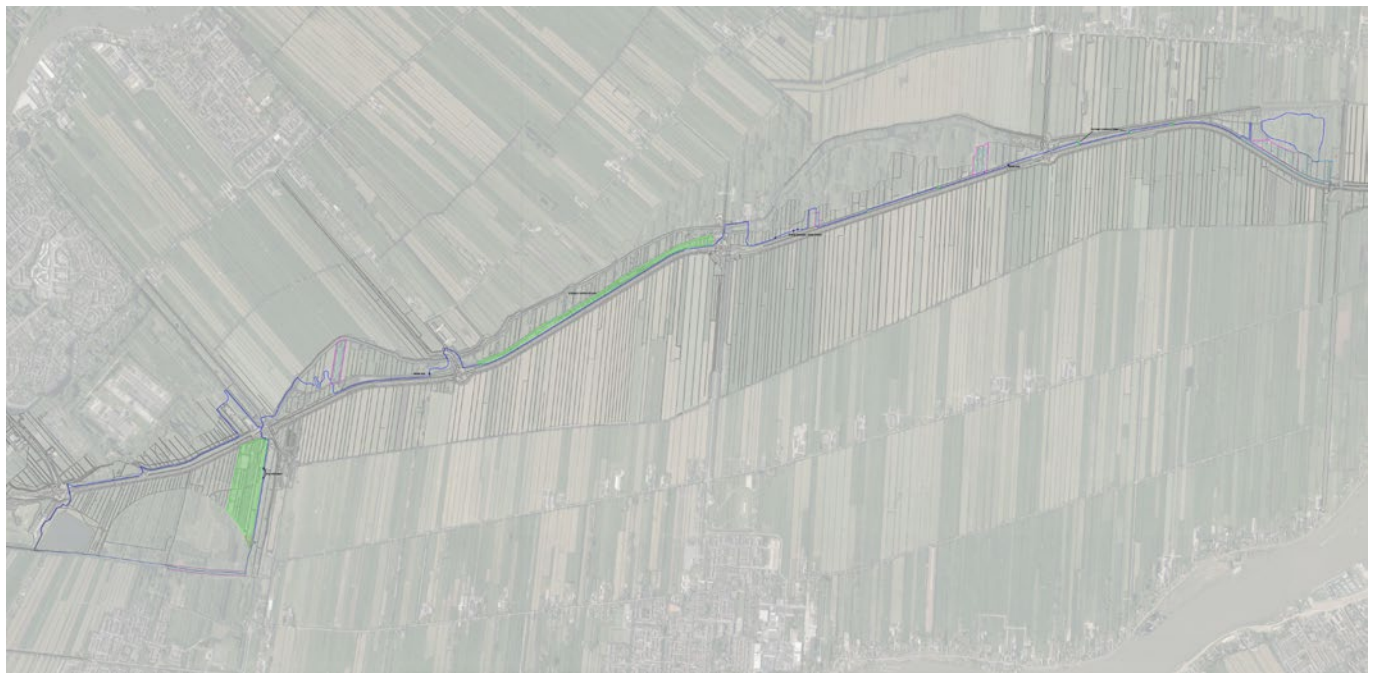

Loetbos

Herinrichting hoofdentree

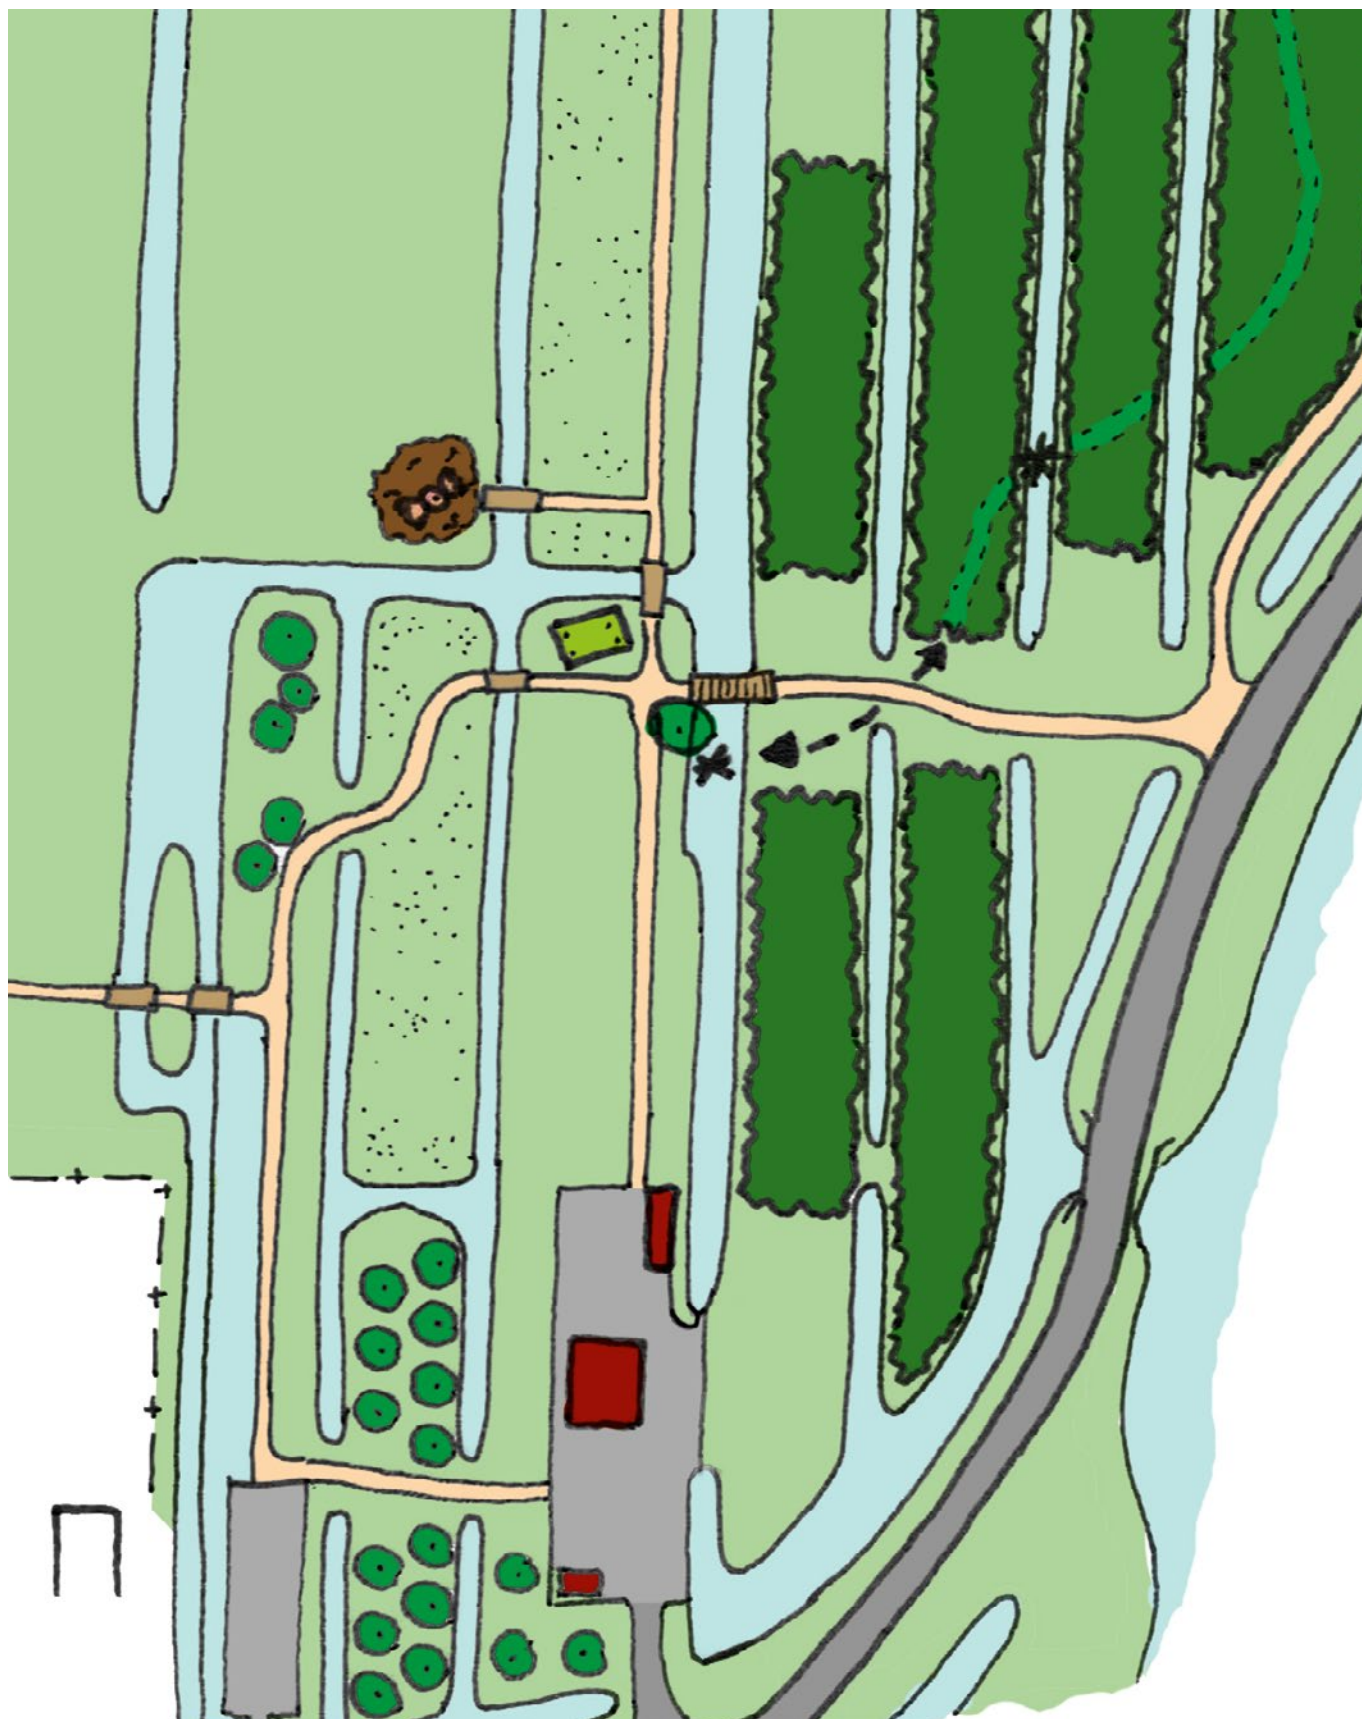


Loetbos

Aanleg centrale ruimte en sanitairgebouw



Reeuwijkse Hout

Avonturenroute, parkeerplaats en entree

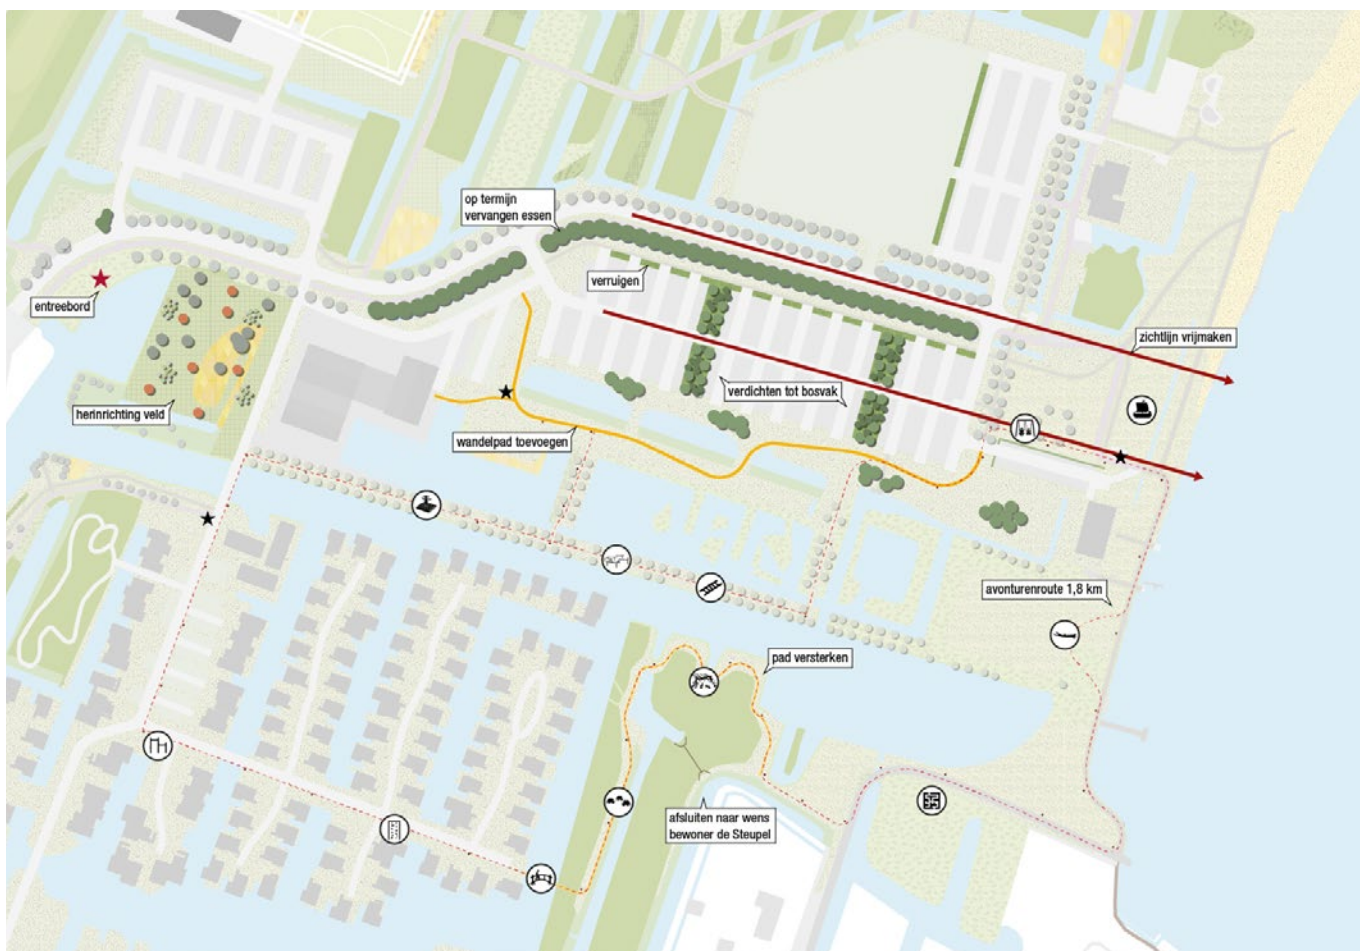


Goudse Hout

Herinrichting entreegebied en natuurspeelplaats



Twaalfmorgen

Herinrichting entree, aanpassing bosvakken en graslandbeheer

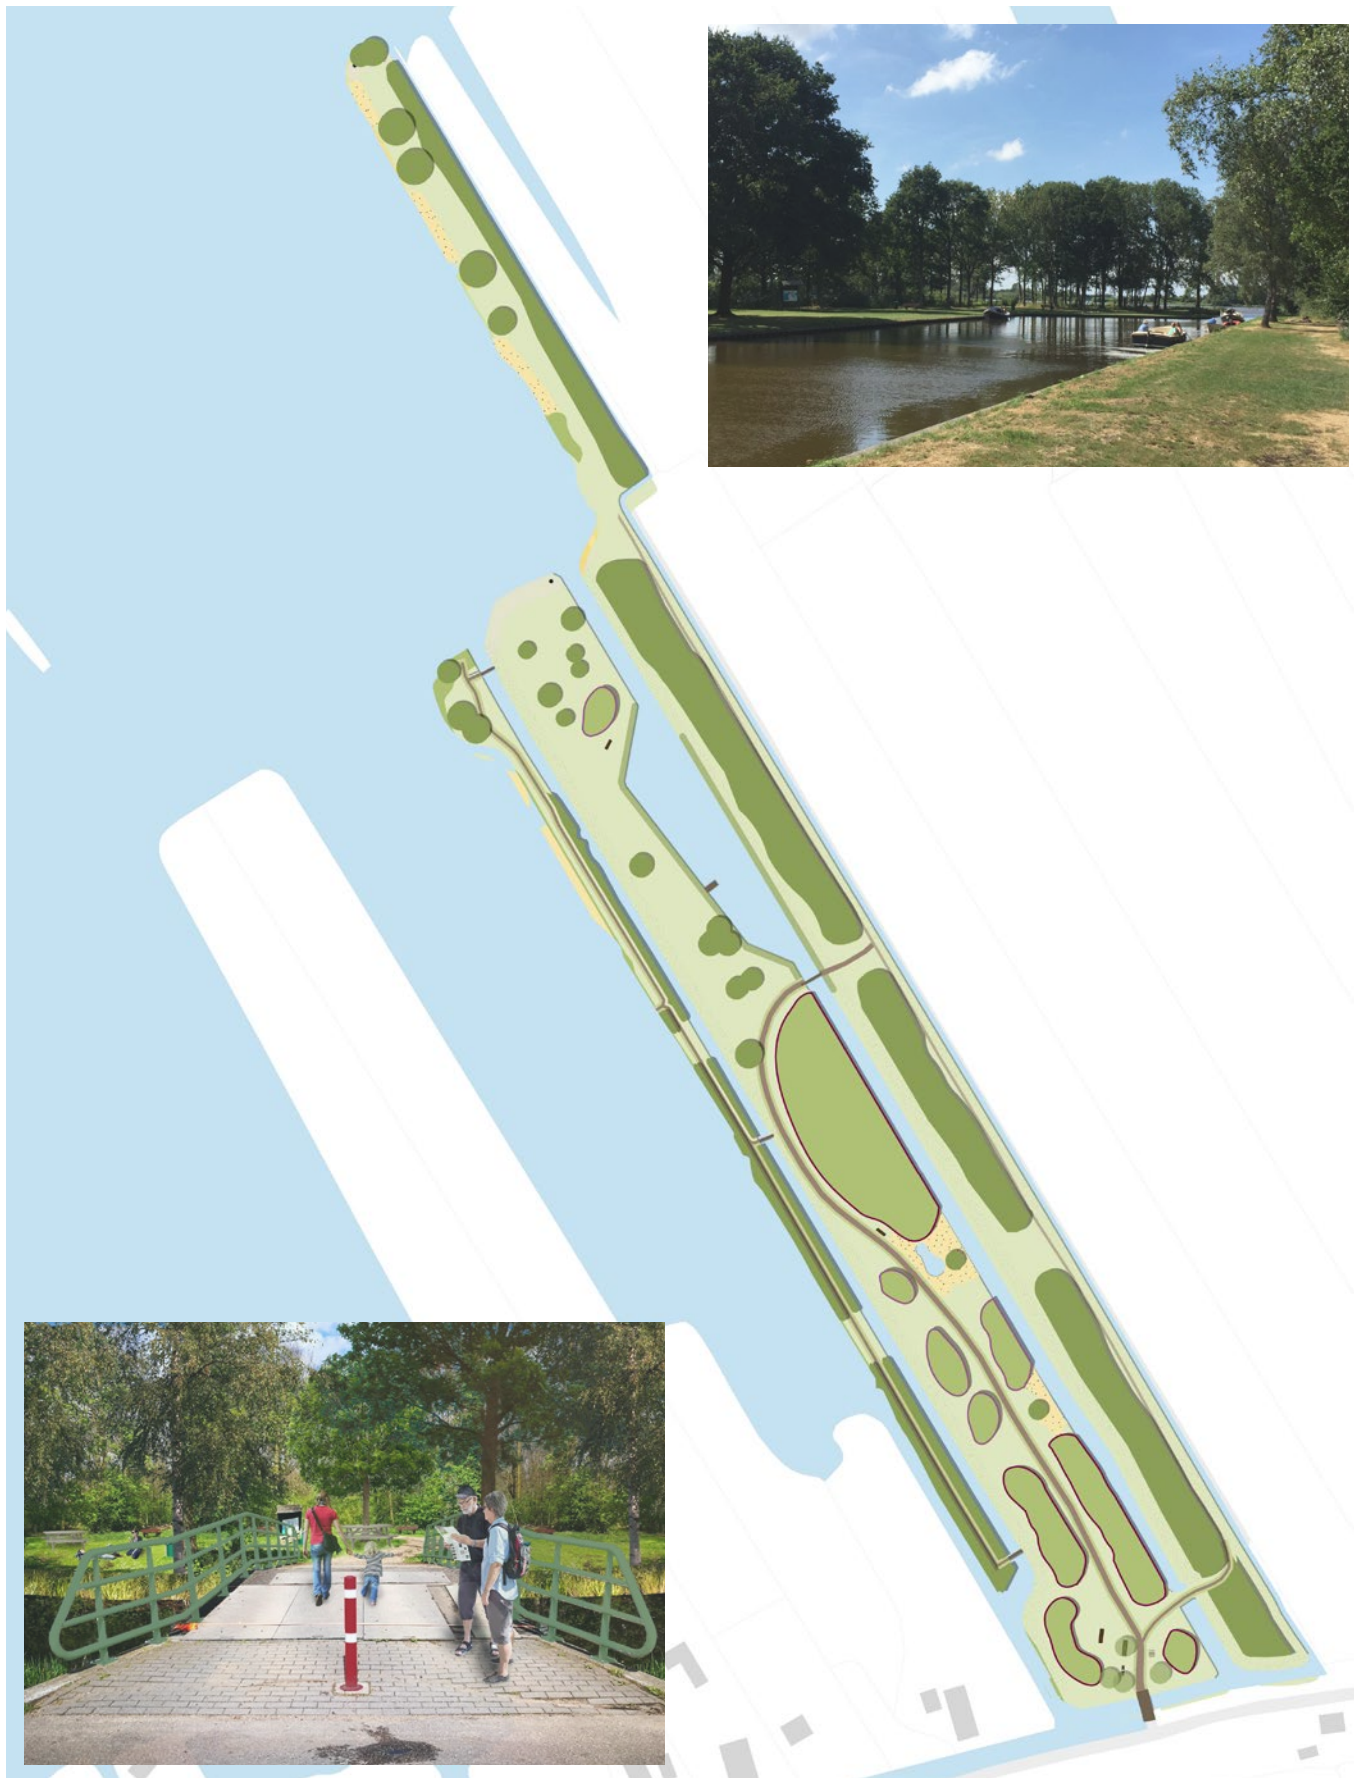

't Weegje / Oostpolder

Herinrichting entreegebied



Toevoegen bomen



Quercus coccinea
'Splendens' (eik)



Alnus Glutinosa
(zwarte Els)



Betula pubescens
(ruwe berk)


Brede bloemrijke (midden)berm



Agrostis canina
(moerasstruisgras)



Molinia Caerulea
(pijpenstrootje)



Peucedanum palustre
(Melkeppe)

Gouwebos

Aanleg natuurspeelplaats





Groenalliantie
Midden-Holland
